



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)				
Objeto Contratual:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ			
Contrato nº:	70/2025-CMM	Prazo de execução da obra:	Início: 18/11/2025	Previsão de Término: 17/01/2026
Empresa Contratada:	N C DE ALCANTARA SOLUCOES EM ENGENHARIA		Responsável Execução:	Naiane Cabral de Alcântara, Engenheira Civil, CREA 1519037643PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ		Responsável Fiscalização:	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Descrição detalhada do objeto:	Ampliação do estacionamento com área aproximada de 276,38 m ² (situada próximo ao portão de saída) totalizando 70 vagas para motocicletas, e, demarcação de 06 vagas para carros onde atualmente está situado o estacionamento de motocicletas (próximo ao portão de entrada).			
Período do RDO:	11/12/2025 até 16/01/2026	Endereço das obras:	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA	

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária do andamento das obras.

Data:	11/12/2025 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Meio-fio do canteiro lateral e proteção de árvore:  Demolição de meio-fio restante para melhor o caimento do novo piso: 



Ocorrências:	
--------------	--

Data:	13/12/2025 (sábado)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Início do espalhamento do colchão de areia e construção de protetor de árvore (meio-fio):  Demolição de meio-fio restante para melhor o caimento do novo piso: 
Ocorrências:	

Data:	15/12/2025 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação do espalhamento do colchão de areia e construção de protetores de árvores (meio-fio): 



Ocorrências:

Data:	16/12/2025 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação do espalhamento do colchão de areia: 



Início de assentamento do bloquetes sextavados:



Locação de piso usando trena e linha:



Ocorrências:

Data:

17/12/2025 (quarta-feira)



Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação do espalhamento do colchão de areia: 
	Confecção de caixa de drenagem: 
	Compactação de colchão de areia com placa vibratória: 
Ocorrências:	



Data:	18/12/2025 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Compactação de colchão de areia com placa vibratória:  Espalhamento de colchão de areia e regularização: 
Ocorrências:	

Data:	19/12/2025 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Visão geral da obra: 

Continuação do assentamento de blocos intertravados:



Molhagem do colchão de areia para melhor compactação:





Caixa de drenagem:



Instalação de refletores:



Ocorrências:

Data: 20/12/2025 (sábado)

Clima: Nublado

Atividades realizadas: Locação de obra para assentamento do piso de acordo com o caimento:





	
Ocorrências:	

Data:	23/12/2025 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação do assentamento do piso intertravado – estacionamento/canteiro central:  



Continuação do assentamento do piso intertravado – estacionamento/canteiro lateral; e acabamento com argamassa nos protetores de árvores:



Visão geral da obra:



Ocorrências:

Data:	29/12/2025 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Plantio de grama em canteiros protetores de árvore:  29/12/2025 08:23 Marabá



Caixa de drenagem rente ao novo piso do estacionamento:



Acabamento em protetor de roda – meio-fio:





	Rejuntamento de bloquetes e compactação mecânica com placa vibratória: 
Ocorrências:	

Data:	30/12/2025 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Locação de obra com linha para correto caimento do piso a ser assentado:  

Retirada de entulho com caixa coletora:



Instalação de eletroduto novo para a fiação que alimenta os postes do estacionamento:



Acabamento com argamassa em protetor de rodas e preenchimento vazios de peças de bloquete divididas para maior fixação do piso:



Construção de rampa em calçada existente:



Desvio em tubulações de água pluvial, tubo de 100mm com dos joelho de 45º e substituição de trecho danificado de 75mm:



Acabamentos da rampa:





Início da execução de canaleta de piso para drenagem da área central do estacionamento:



Ocorrências:

Data:	31/12/2025 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Visão geral da obra: 



Refletores instalados:



Continuação da execução da canaleta de piso do estacionamento:



Acabamento de junta entre piso do acesso de carros e o piso novo do estacionamento de motos:



Ocorrências:



Data:	02/01/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Início da pintura de demarcação das faixas do novo estacionamento de motos:  02/01/2026 09:40 Marabá  02/01/2026 09:57 Marabá Continuação do assentamento dos bloquetes:  02/01/2026 10:04 Marabá

Acabamentos de junta entre pisos com argamassa:



Acabamentos de protetores de árvores com argamassa:





Espalhamento de mistura de areia e argamassa para rejuntamento dos blocos:




Compactação de blocos intertravados com placa vibratória:



Limpeza da obra:




Visão geral da obra no período noturno com os refletores instalados em funcionamento:

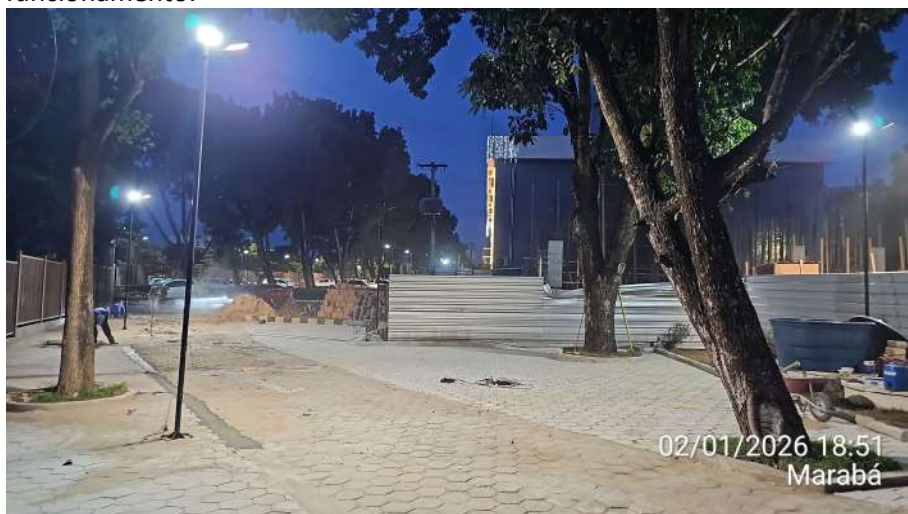

Ocorrências:



Data:	03/01/2026 (sábado)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Limpeza da obra:  03/01/2026 08:26 Marabá  03/01/2026 13:39 Marabá Continuação de acabamentos com argamassa:  03/01/2026 08:52 Marabá

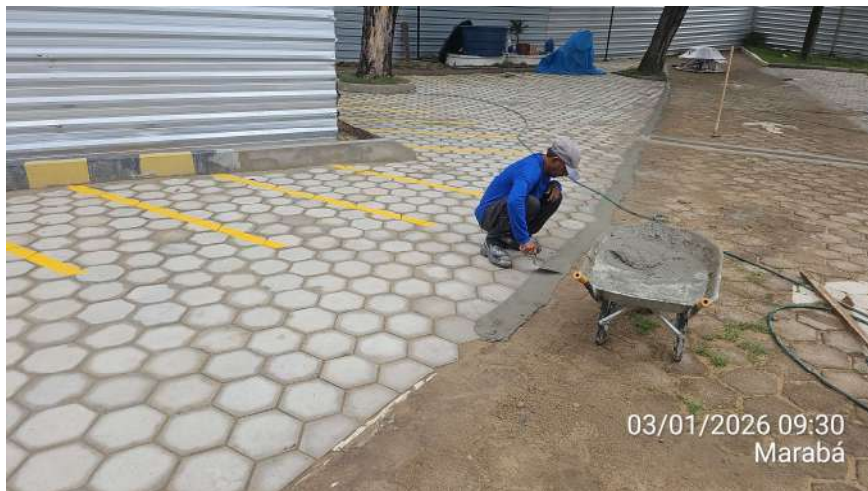





Instalação de placa de sinalização vertical para as novas vagas de carros institucionais e de acessibilidade:



Ocorrências:

Data:	05/01/2026 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Placas de sinalização vertical do estacionamento de motos instaladas:  Estacionamento central de motos com faixas de demarcação e meio-fio sinalizados:  Estacionamento lateral de motos com faixas de demarcação e meio-fio sinalizados: 
Ocorrências:	



Data:	12/01/2026 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Grade da canaleta de piso instalada:  12/01/2026 17:39 Marabá  12/01/2026 17:40 Marabá Grade para caixa de drenagem instalada viabilizar o trânsito de motos:  12/01/2026 17:41 Marabá



	Visão geral do novo estacionamento de motos com a sinalização finalizada: 
Ocorrências:	

Data:	13/01/2026 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Retirada de postes metálicos para suspensão da base para o mesmo nível do novo piso intertravado:  Nova base de concreto com parafusos chumbados: 



Remoção/Apagamento de faixas do antigo estacionamento de motos da entrada, com uso de lixa e pintura em cor próxima ao piso:





Pintura da sinalização das vagas de carros:



Limpeza do local:




Ocorrências:

Data:	14/01/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação da pintura das vagas de carros:



	 14/01/2026 10:12 Marabá
Ocorrências:	

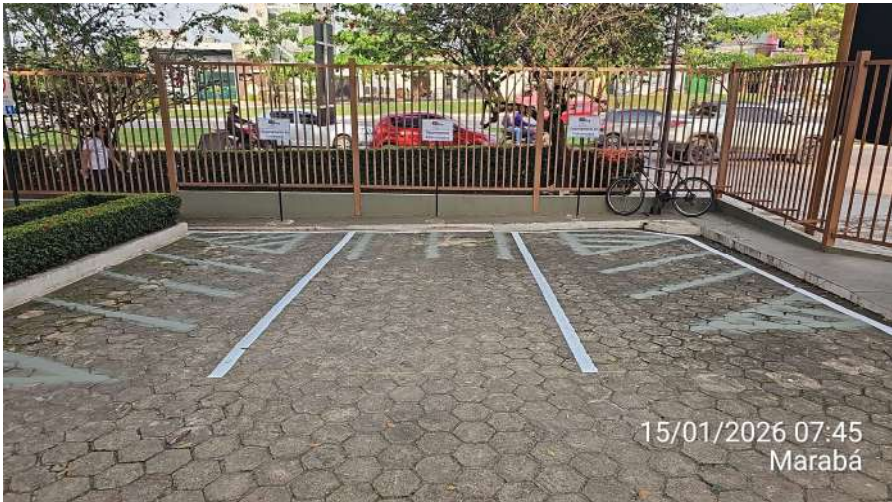Data:	15/01/2026 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Pintura para sinalização das vagas de carros institucionais, onde eram as vagas de motos:  15/01/2026 07:45 Marabá  15/01/2026 12:49 Marabá

	Colocação de postes metálicos em nova base no nível do piso: 
Ocorrências:	

Data:	16/01/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Novo estacionamento de motos em uso: 

Ocorrências:	

Marabá/PA, 18 de janeiro de 2026.

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato
