



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)				
Objeto Contratual:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ			
Contrato nº:	70/2025-CMM	Prazo de execução da obra:	Início: 18/11/2025	Previsão de Término: 17/01/2026
Empresa Contratada:	N C DE ALCANTARA SOLUCOES EM ENGENHARIA		Responsável Execução:	Naiane Cabral de Alcântara, Engenheira Civil, CREA 1519037643PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ		Responsável Fiscalização:	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Descrição detalhada do objeto:	Ampliação do estacionamento com área aproximada de 276,38 m ² (situada próximo ao portão de saída) totalizando 70 vagas para motocicletas, e, demarcação de 06 vagas para carros onde atualmente está situado o estacionamento de motocicletas (próximo ao portão de entrada).			
Período do RDO:	11/12/2025 até 16/01/2026	Endereço das obras:	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA	

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária do andamento das obras.

Data:	11/12/2025 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Demolição de meio-fio restante para melhor o caimento do novo piso:  11/12/2025 11:08 Marabá
Ocorrências:	

Data:	17/12/2025 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Compactação de colchão de areia com placa vibratória:



	
Ocorrências:	

Data:	18/12/2025 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Compactação de colchão de areia com placa vibratória: 
Ocorrências:	

Data:	20/12/2025 (sábado)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Locação de obra para assentamento do piso de acordo com o caimento:

	 20/12/2025 11:09 Marabá  20/12/2025 11:08 Marabá
Ocorrências:	

Data:	23/12/2025 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação do assentamento do piso intertravado – estacionamento/canteiro central:  23/12/2025 14:14 Marabá



Continuação do assentamento do piso intertravado – estacionamento/canteiro lateral; e acabamento com argamassa nos protetores de árvores:



Visão geral da obra:



Ocorrências:

Data:	29/12/2025 (segunda-feira)
Clima:	Nublado

**Atividades
realizadas:**

Plantio de grama em canteiros protetores de árvores:



Acabamento em protetor de roda – meio-fio:





	Rejuntamento de bloquetes e compactação mecânica com placa vibratória: 
Ocorrências:	

Data:	30/12/2025 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Locação de obra com linha para correto caimento do piso a ser assentado:  

Retirada de entulho com caixa coletora:



Instalação de eletroduto novo para a fiação que alimenta os postes do estacionamento:



Acabamento com argamassa em protetor de rodas e preenchimento vazios de peças de bloquete divididas para maior fixação do piso:



Construção de rampa em calçada existente:



Desvio em tubulações de água pluvial, tubo de 100mm com dos joelho de 45º e substituição de trecho danificado de 75mm:



Acabamentos da rampa:





Início da execução de canaleta de piso para drenagem da área central do estacionamento:



Ocorrências:

Data:	31/12/2025 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Visão geral da obra: 

Continuação da execução da canaleta de piso do estacionamento:




Acabamento de junta entre piso do acesso de carros e o piso novo do estacionamento de motos:



Ocorrências:

Data:	02/01/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Continuação do assentamento dos bloquetes:  02/01/2026 10:04 Marabá Acabamentos de junta entre pisos com argamassa:  02/01/2026 14:56 Marabá  02/01/2026 17:15 Marabá Acabamentos de protetores de árvores com argamassa:

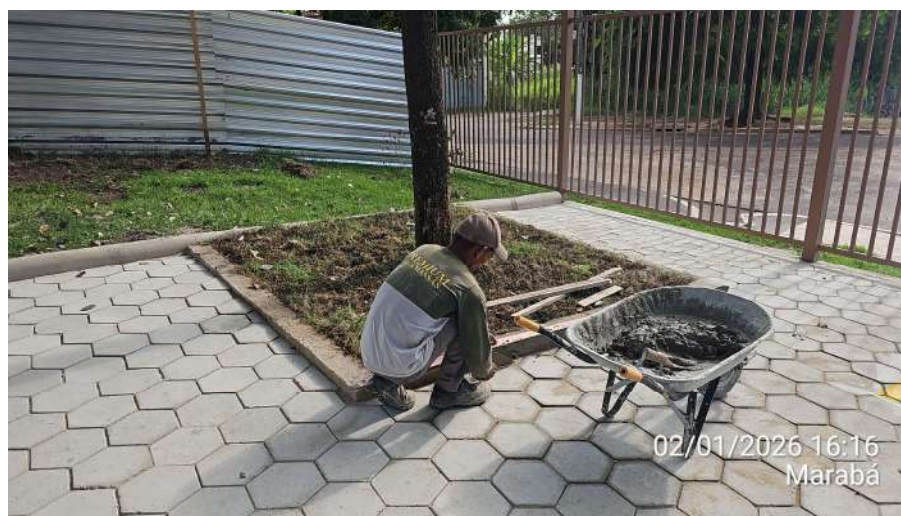

Espalhamento de mistura de areia e argamassa para rejuntamento dos blocos e posterior compactação com placa vibratória:





Compactação de blocos intertravados com placa vibratória:




Ocorrências:

Data: 03/01/2026 (sábado)

Clima: Nublado

Atividades realizadas: Limpeza da obra:

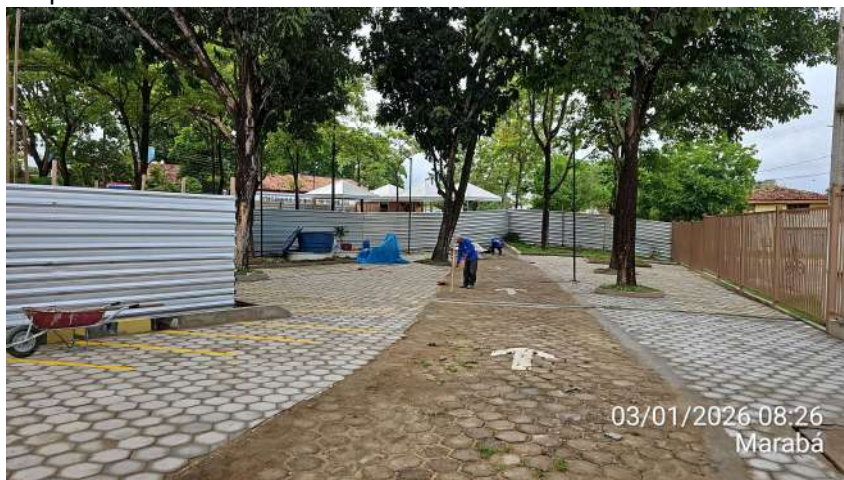



Continuação de acabamentos com argamassa:







Ocorrências:

Data:	12/01/2026 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Grade da canaleta de piso instalada:



Grade para caixa de drenagem instalada viabilizar o trânsito de motos:



Visão geral do novo estacionamento de motos com a sinalização finalizada:



	
Ocorrências:	

Data:	13/01/2026 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Retirada de postes metálicos para suspensão da base para o mesmo nível do novo piso intertravado:  Nova base de concreto com parafusos chumbados: 



Pintura em cor próxima ao piso das faixas do antigo estacionamento de motos, pois não foi possível remover a tinta antiga com lixamento – lateral esquerda



Ocorrências:

Data:	15/01/2026 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Pintura em cor próxima ao piso das faixas do antigo estacionamento de motos, pois não foi possível remover a tinta antiga com lixamento – lateral direita   Colocação de postes metálicos em nova base no nível do piso: 



	
Ocorrências:	

Data:	24/01/2026 (sábado)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Visão geral do novo estacionamento de motos finalizado: 
Ocorrências:	

Marabá/PA, 24 de fevereiro de 2026.

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato
