



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)				
Objeto Contratual:	Contratação de empresa especializada para ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Marabá - Anexo I e Anexo II			
Contrato nº:	64/2025-CMM	Prazo de execução da obra:	Início: 06/10/2025	Previsão de Término: 06/10/2026
Empresa Contratada:	MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		Responsável Execução:	Rafael Ivo da Silva, Engenheiro Civil, CREA 1515086003PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ		Responsável Fiscalização:	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Lote/Anexo 01:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I			
Lote/Anexo 02:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II			
Período do RDO:	07/01/2026 a 03/02/2026	Endereço das obras:	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA	

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária do andamento das obras.

Data:	07/01/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – visão geral, marcação das nervuras e vigotas da laje:  Anexo 01 – colocação de fôrmas das nervuras e escoramento metálico da laje:



Anexo 02 – Escavação para inclinação do assentamento de manilhas:



Ocorrências:

Data:	08/01/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Armação de pilares do segundo pavimento:




Anexo 01 – corpos de prova em processo de cura submersa:



Anexo 02 – Continuação de fôrmas de madeira das vigas:



Anexo 01 – Laje com escoramento:

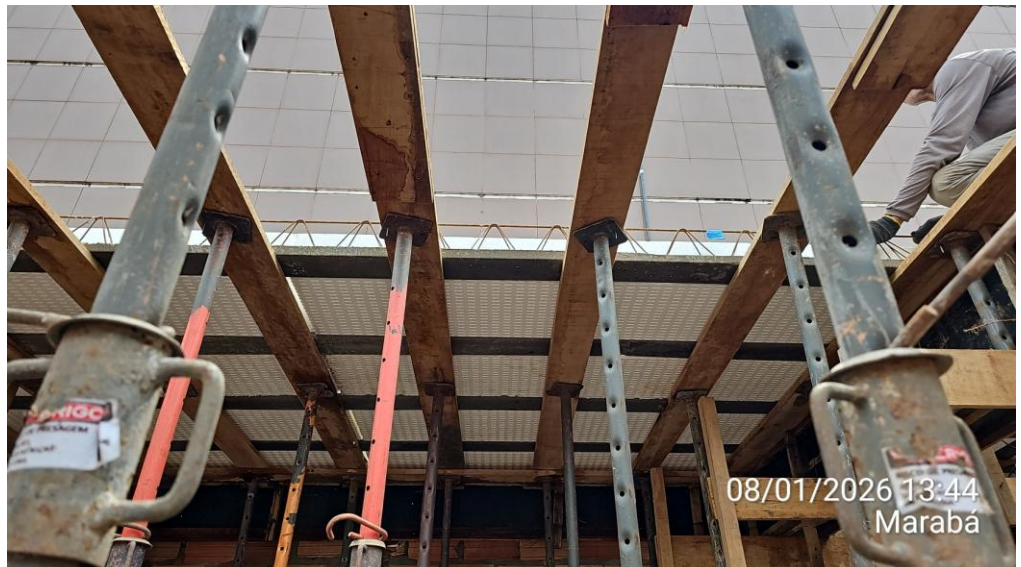

Ocorrências:

Data:	09/01/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Montagem de armação de vigas do 1º pavimento:



Anexo 01 – Início da montagem da laje:



Ocorrências:


Data:	12/01/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Assentamento de tubo de concreto com reaterro:



Anexo 02 – Continuação de armação de vigas:



Anexo 01 – Passagem de eletrodutos pela laje:

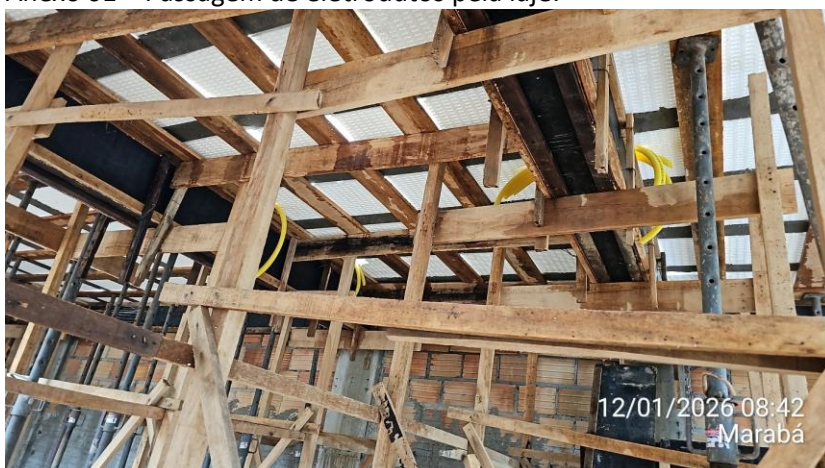



Anexo 01 – Escoramento metálico da laje:




Anexo 01 – Laje montada com treliças, EPS, tela, nervuras e armaduras negativas e positivas:





Ocorrências:

Data:	13/01/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Limpeza e espalhamento de aterro da área central para montagem de escoramento de viga e laje:  13/01/2026 08:12 Marabá Anexo 02 – Continuação de armação de vigas:  13/01/2026 08:15 Marabá Anexo 01 – Concretagem da 1ª laje:  13/01/2026 10:51 Marabá

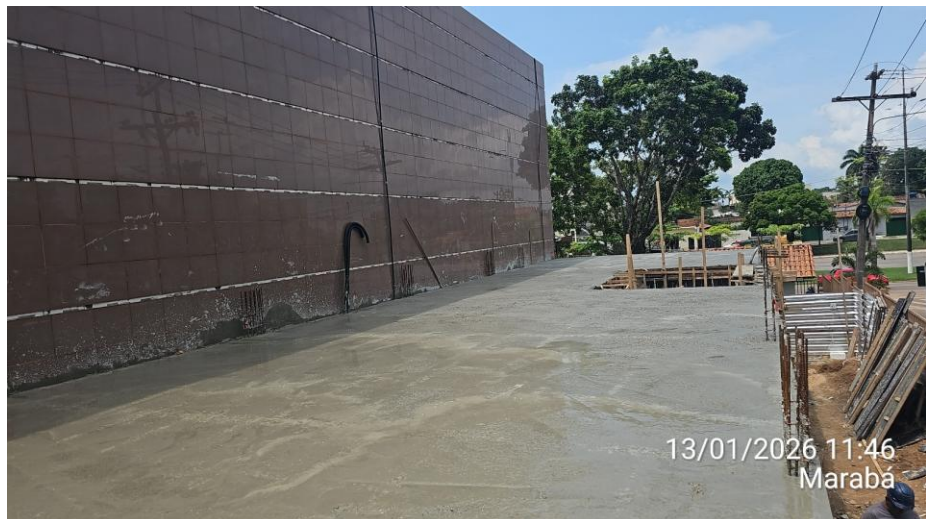

Anexo 02 – Alvenaria da guarita:



Ocorrências:

Data: 14/01/2026 (quarta-feira)



Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação de armação de vigas:  Anexo 01 – Posicionamento da armação do segundo pavimento do Anexo 1 e marcação da alvenaria:  Anexo 02 – Continuação da alvenaria da guarita: 
Ocorrências:	



Data:	15/01/2026 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação de armação de vigas:   



Anexo 02 – Continuação da alvenaria da guarita com vergas e contra-vergas das janelas:



Anexo 01 – Continuação da alvenaria do anexo 01 e posicionamento dos pilares do 2º pavimento.



Ocorrências:

Data:	16/01/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação de armação de vigas:



Anexo 02 – Início do fechamento das laterais das fôrmas das vigas:



Anexo 01 – Continuação da alvenaria do 2º pavimento:



Vista frontal da obra Anexo 01:






Ocorrências:	

Data:	19/01/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação de armação de vigas:   



Anexo 02 – Continuação do fechamento das laterais das fôrmas das vigas:

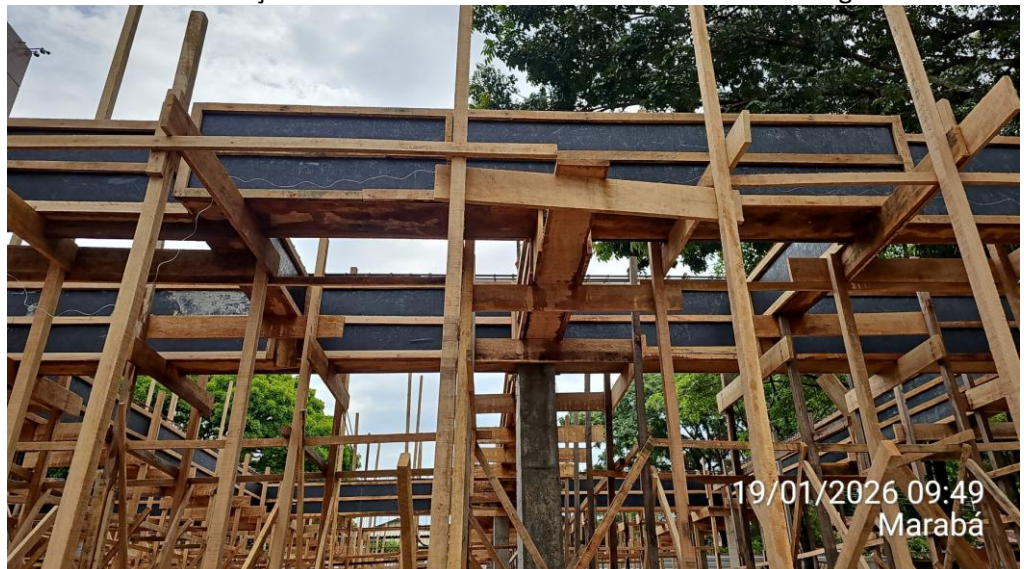



Anexo 01 – Continuação da alvenaria do 2º pavimento: e colocação das fôrmas dos pilares e cura da laje:





Ocorrências:	

Data:	20/01/2026 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação de armação de vigas:   Anexo 02 – Continuação do fechamento das laterais das fôrmas das vigas:




Anexo 01 – Concretagem de contra-verga e pilares do 2º pavimento do anexo 01:





	
Ocorrências:	

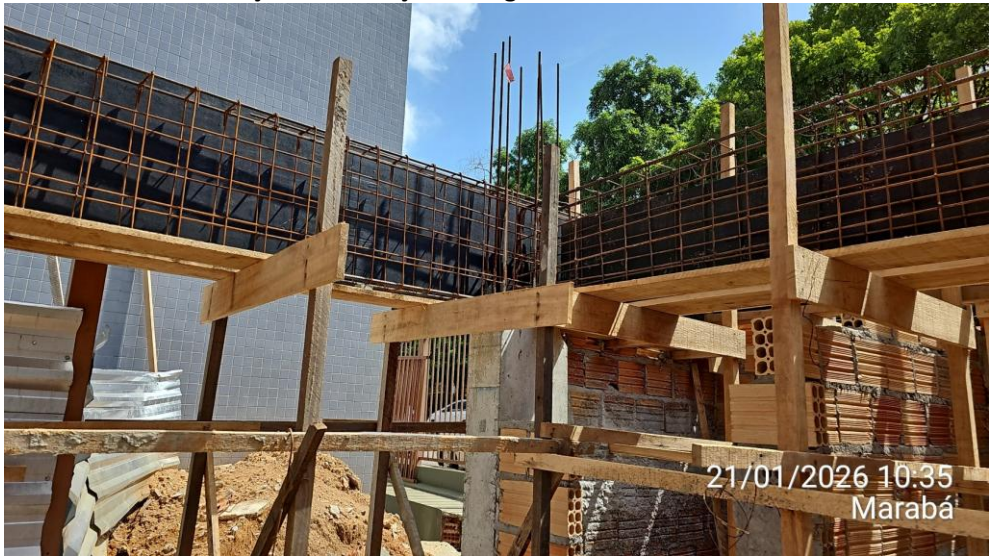Data:	21/01/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação de armação de vigas e fechamento lateral das fôrmas:  



Cocada/espacado no fundo das vigas:





	Anexo 01 – Vista frontal do anexo 01: 
Ocorrências:	

Data:	22/01/2026 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do fechamento lateral das fôrmas das vigas:  Anexo 01 – continuação do anexo 01: 



	 22/01/2026 12:40 Marabá
Ocorrências:	

Data:	23/01/2026 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Início de montagem da laje e colocação do escoramento metálico do anexo 02:  23/01/2026 11:55 Marabá Anexo 01 – Escavação para instalação de esgoto dos banheiros do pavimento térreo do Anexo 01:



Anexo 01 – Continuação da alvenaria e desfôrma de pilares:





	Anexo 01 – Instalação de tubos e conexões de água fria e esgoto dos banheiros do pavimento térreo: 
Ocorrências:	

Data:	24/01/2026 (sábado)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da montagem da laje e colocação do escoramento metálico do anexo 02: 



Anexo 01 – Instalação de água fria e esgoto dos banheiros do pavimento térreo do Anexo 01 com rasgos e reaterro:



Anexo 01 – Continuação da alvenaria:





Anexo 02 – Instalação de água fria da guarita do estacionamento:



Anexo 02 – Vista frontal da obra anexo 02:



Ocorrências:



Data:	26/01/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da montagem da laje e colocação do escoramento metálico do anexo 02:  



Anexo 01 – concretagem de lance de pilares:



Anexo 01 – Retirada de escoramento de laje:



Anexo 02 – Instalação de água fria e esgoto da guarita do estacionamento:



Anexo 01 – Vista lateral da obra anexo 01:



	
Ocorrências:	

Data:	27/01/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação armação do capeamento da laje anexo 02, ferro 5.0mm cada 20cm:  Anexo 02 – Apoio das vigotas pré-moldadas nas vigas e armação de malha para a capa de concreto:



Anexo 02 – cocada no fundo da viga para cobrimento:



Anexo 01 – Início do reboco do Anexo 01:



	
Ocorrências:	

Data:	28/01/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação armação do capeamento da laje anexo 02, ferro 5.0mm cada 20cm e passagem de eletrodutos pela laje: 





Anexo 02 – Espera para passagem de eletroduto dos quadros de distribuição dos pavimentos superiores:



Anexo 02 – Detalhe de nervura com armação 2x10mm conforme projeto:



Anexo 02 – passagem de tubulações para instalação de esgoto e água pluvial pelos lavabos



Anexo 01 – Continuação do reboco do Anexo 01 e execução de rasgos para eletrodutos:



Anexo 01 – Escoramento das vigas do 2º pavimento do anexo 01:



Anexo 01 – Desmontagem de fôrma de vigas superiores do anexo 01:



Ocorrências:



Data:	29/01/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Passagem de tubulações para instalação de esgoto e água pluvial pelos lavabos:   




	
Ocorrências:	

Data:	30/01/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação do reboco do Anexo 01, execução de rasgos e passagem de eletrodutos:  





Anexo 01 – Escoramento das vigas do 2º pavimento do anexo 01:

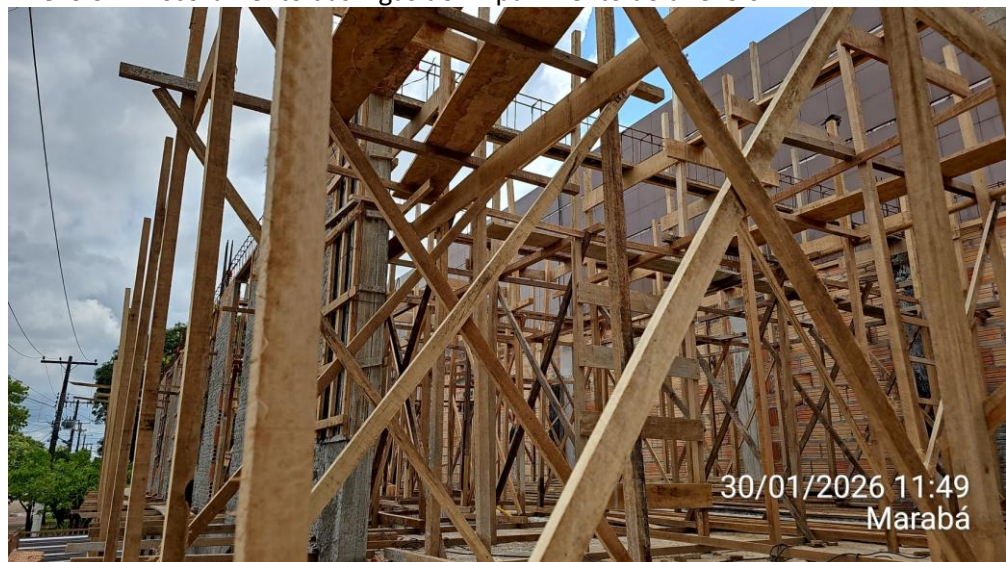

Anexo 01 – Chapisco nas faces externas das paredes do anexo 01:



	
Ocorrências:	

Data:	02/01/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Concretagem da 1ª laje juntamente com as vigas: 



Lançamento, adensamento e acabamento de concreto usinado:







Anexo 01 – Montagem e armação de vigas da laje de cobertura do anexo 01:



Anexo 01 – Visão geral da obra do anexo 01:



Anexo 01 – Reboco da parede do fundo onde serão os banheiros do térreo:



Ocorrências:

Data:	03/01/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – posicionamento de armação de pilares do 2º pavimento da obra: 

Anexo 02 – Cura da laje:



Anexo 01 – Continuação da montagem da armadura das vigas da laje de cobertura do Anexo 01:



Ocorrências: Visita do corpo técnico da Vale e do MPPA para a medição mensal das obras.



CÂMARA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

Marabá/PA, 03 de fevereiro de 2026.

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato
