



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)				
Objeto Contratual:	Contratação de empresa especializada para ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Marabá - Anexo I e Anexo II			
Contrato nº:	64/2025-CMM	Prazo de execução da obra:	Início: 06/10/2025	Previsão de Término: 06/10/2026
Empresa Contratada:	MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		Responsável Execução:	Rafael Ivo da Silva, Engenheiro Civil, CREA 1515086003PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ		Responsável Fiscalização:	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Lote/Anexo 01:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I			
Lote/Anexo 02:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II			
Período do RDO:	04/02/2026 a 09/03/2026	Endereço das obras:	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA	

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária do andamento das obras.

Data:	04/02/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Montagem das fôrmas das vigas da laje de cobertura do Anexo 01: 



Anexo 01 – Execução de contrapiso do pavimento térreo do Anexo 01:



Anexo 02 – Montagem das fôrmas dos pilares do 2º pavimento do Anexo 02:



	 04/02/2026 08:17 Marabá
Ocorrências:	

Data:	05/02/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Montagem das fôrmas dos pilares do 2º pavimento do Anexo 02:  05/02/2026 10:16
Ocorrências:	

Data:	07/02/2026 (sábado)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Concretagem dos pilares do 2º pavimento do Anexo 02:  07/02/2026 08:17



Anexo 01 – Instalação de caixas sifonadas e tubulação dos banheiros do térreo:



Ocorrências:

Data: 09/02/2026 (segunda-feira)

Clima: Sol

Atividades realizadas:

Anexo 02 – Desfôrma dos pilares do 2º pavimento do Anexo 02:





	Anexo 01 – Passagem de eletrodutos do QGBT pelo piso até parede: 
Ocorrências:	

Data:	10/02/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Reboco das paredes externas do pavimento térreo do Anexo 01:  Anexo 02 – Montagem do escoramento das vigas do 2º pavimento do Anexo 02:



	
Ocorrências:	

Data:	11/02/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação do reboco das paredes externas do pavimento térreo do Anexo 01: 

Anexo 01 – Montagem de fôrmas de nervuras da laje de cobertura do Anexo 01 (forro do pavimento superior):



Anexo 02 – Continuação da montagem do escoramento das vigas do 2º pavimento do Anexo 02:




Ocorrências:

Data: 12/02/2026 (quinta-feira)

Clima: Sol

Atividades realizadas: Anexo 01 – Rasgo para passagem de eletrodutos de lógica em alvenaria do pavimento térreo do Anexo 01:

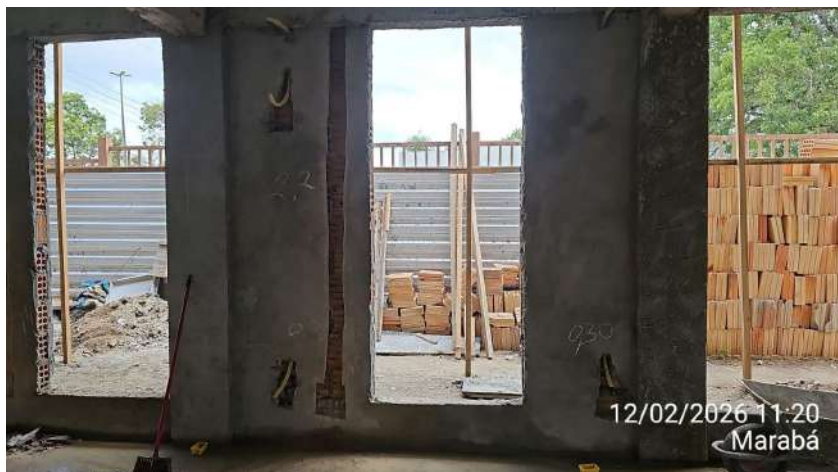



Anexo 02 – Continuação da montagem do escoramento das vigas do 2º pavimento do Anexo 02:



Ocorrências:

Data:	13/02/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Rasgo para passagem de eletrodutos e caixas de lógica e internet em alvenaria e no piso do pavimento térreo do Anexo 01:  Anexo 01 – Vigotas da laje de cobertura do Anexo 01:



Anexo 02 – Início da armação das vigas do 2º pavimento do Anexo 02:



Ocorrências:



Data:	18/02/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Reboco externo de parte da fachada dos fundos do Anexo 01:  Anexo 02 – Continuação da armação das vigas do 2º pavimento do Anexo 02:  



	
Ocorrências:	

Data:	19/02/2026 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Remoção de fôrmas de vigas da 1ª laje do Anexo 02:  Anexo 02 – Continuação da armação das vigas do 2º pavimento do Anexo 02:



Ocorrências:

Data: 20/02/2026 (sexta-feira)

Clima: Sol

Atividades realizadas: Anexo 02 – Continuação da armação das vigas do 2º pavimento do Anexo 02:





Anexo 01 – Escoramento metálico da laje de cobertura do Anexo 01:





Ocorrências:	
--------------	--

Data:	23/02/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da armação das vigas do 2º pavimento do Anexo 02:  Anexo 02 – Início da montagem das fôrmas das vigas do 2º pavimento do Anexo 02: 



Ocorrências:

Data:	24/02/2026 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da montagem das fôrmas das vigas do 2º pavimento do Anexo 02:



Anexo 02 – Remoção das escoras metálicas da 1ª laje do Anexo 02:



Anexo 01 – Montagem da laje de cobertura do Anexo 01:





	Anexo 02 – Regularização de solo do estacionamento. 
Ocorrências:	


Data:	25/02/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da montagem das fôrmas das vigas do 2º pavimento do Anexo 02: 




Anexo 01 – Montagem da laje de cobertura do Anexo 01 com armaduras negativas e positivas posicionadas:





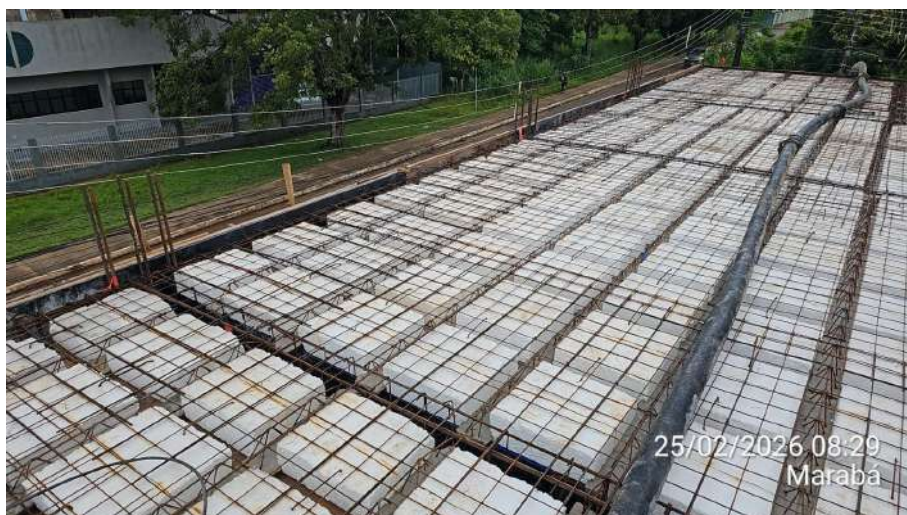

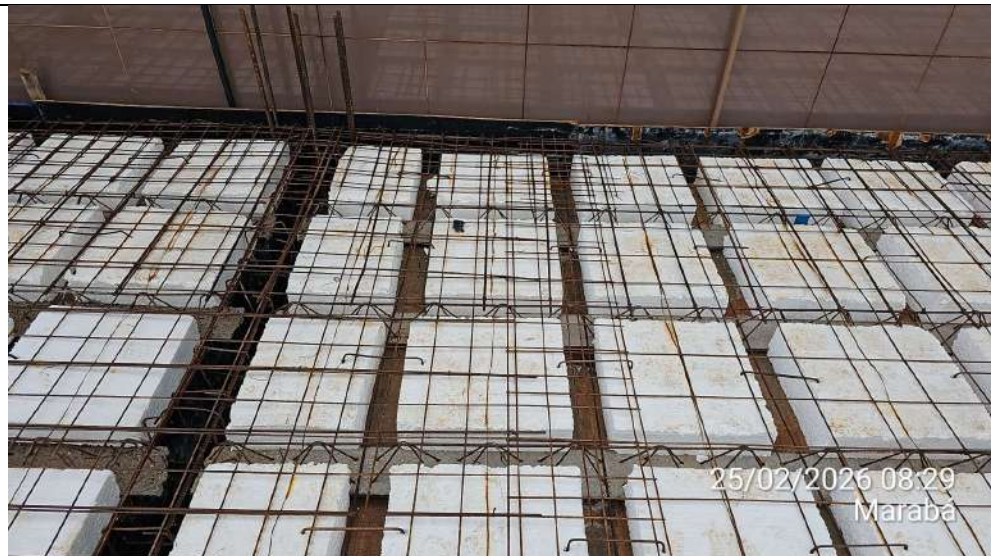








Anexo 01 – Concretagem da laje de cobertura.



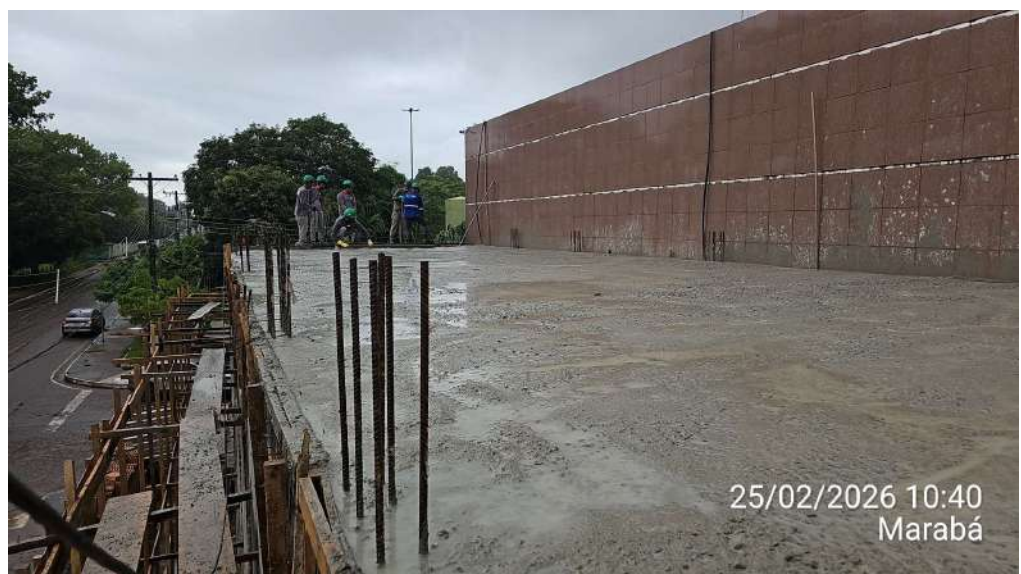

Anexo 02 – Continuação da armação das vigas da 2ª laje do Anexo 02.








	
Ocorrências:	

Data:	26/02/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Posicionamento da armadura dos pilares da cobertura/platibanda: 



Anexo 02 – Continuação da montagem das fôrmas das vigas do 2º pavimento do Anexo 02:

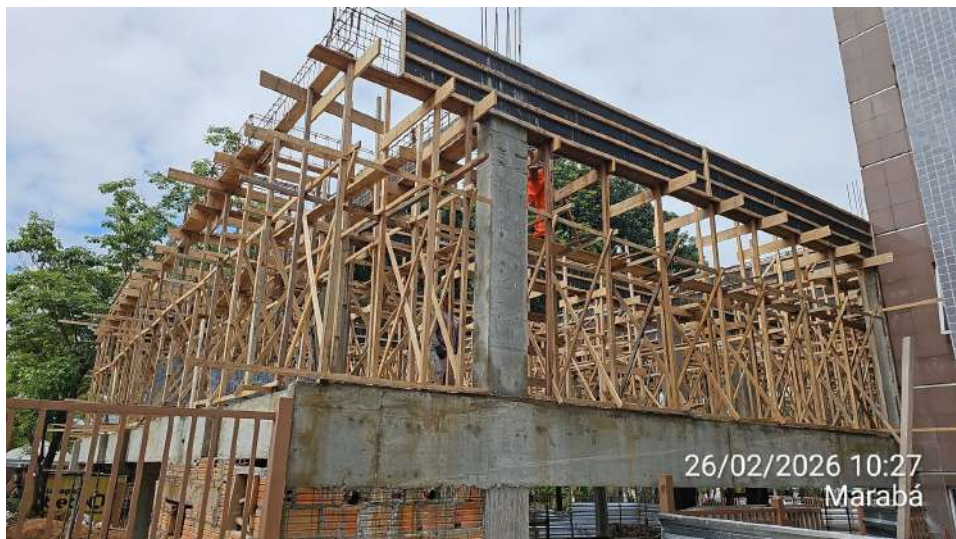


Ocorrências:

Data:	27/02/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Início de montagem da laje do 2º pavimento do Anexo 02:



Anexo 02 – Início da colocação do escoramento metálico da laje do 2º pavimento do Anexo 02:

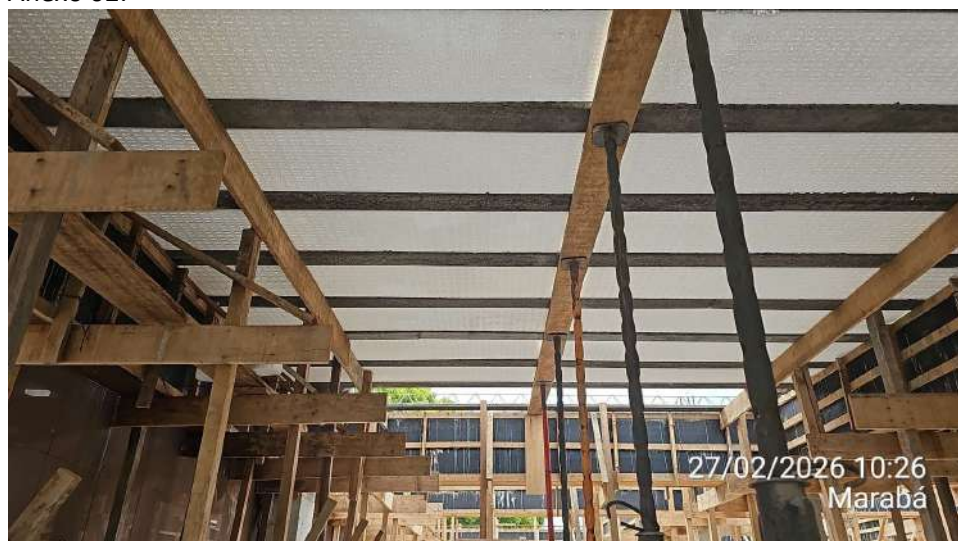



Anexo 02 – Regularização do solo do estacionamento:



Ocorrências:

Data:	03/03/2026 (terça-feira)
Clima:	Chuva e nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da montagem da laje do 2º pavimento do Anexo 02:


Anexo 02 – Início do reboco do lavabo do estacionamento e depósito:



Anexo 02 – Regularização do solo do estacionamento:



Anexo 01 – Remoção de escoramento metálico da laje de cobertura pela empresa executora da obra:

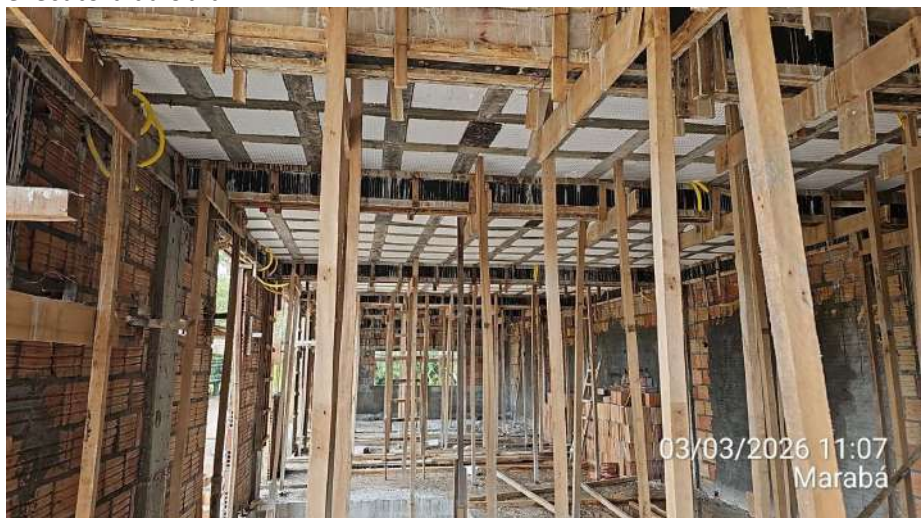

Ocorrências: A ocorrência de chuvas impactou no andamento das obras.



Data:	05/03/2026 (quinta-feira)
Clima:	Chuva e nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da montagem da laje do 2º pavimento do Anexo 02:  Anexo 02 – Continuação do reboco do lavabo do estacionamento e depósito:  Anexo 02 – Montagem da estrutura para uma nova guarita, devido a necessidade da Câmara de um depósito externo que ficará onde seria a guarita (ao lado):



	
Ocorrências:	A ocorrência de chuvas impactou no andamento das obras.

Data:	06/03/2026 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da montagem da laje do 2º pavimento do Anexo 02: 
Ocorrências:	



Data:	07/03/2026 (sábado)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação do chapisco externo e interno da obra do Anexo 01:   
Ocorrências:	



Data:	09/03/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Armação da laje do 2º pavimento do Anexo 02:   
Ocorrências:	

Marabá/PA, 11 de março de 2026.

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato
