



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)				
Objeto Contratual:	Contratação de empresa especializada para ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Marabá - Anexo I e Anexo II			
Contrato nº:	64/2025-CMM	Prazo de execução da obra:	Início: 06/10/2025	Previsão de Término: 06/10/2026
Empresa Contratada:	MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		Responsável Execução:	Rafael Ivo da Silva, Engenheiro Civil, CREA 1515086003PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ		Responsável Fiscalização:	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Lote/Anexo 01:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I			
Lote/Anexo 02:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II			
Período do RDO:	10/03/2026 a 08/04/2026	Endereço das obras:	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA	

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária do andamento das obras.

Data:	10/03/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação do chapisco do 2º pavimento:  Anexo 02 – Passagem de eletrodutos e tubulação de esgoto na 2ª laje do Anexo 02:



	
Ocorrências:	

Data:	11/03/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Armação e fôrmas da escada do Anexo 01: 





Anexo 02 – Alvenaria da nova guarita do Anexo 02:



Ocorrências:



Data:	12/03/2026 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação da montagem da fôrma da escada do Anexo 01:  Anexo 01 - Colocação de cocadas na parte inferior da armadura da escada:  Anexo 02 – Concretagem da 2ª laje do Anexo 02: 



Ocorrências:

Data:	13/03/2026 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Concretagem da escada do Anexo 01: 



Ocorrências:	

Data:	14/03/2026 (sábado)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Posicionamento das armaduras dos pilares do 3º pavimento do Anexo 02:   Anexo 02 – Reboco da nova guarita do Anexo 02:



	
Ocorrências:	

Data:	16/03/2026 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Montagem das fôrmas dos pilares do 3º pavimento do Anexo 02:  Anexo 01 – Alvenaria da platibanda do Anexo 01:



Anexo 01 – Reboco das paredes internas do pavimento superior:



Ocorrências:



Data:	17/03/2026 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Montagem das fôrmas dos pilares do 3º pavimento do Anexo 02:  Anexo 01 – Continuação da alvenaria da platibanda do Anexo 01:



Anexo 02 – Regularização do solo do estacionamento:



Ocorrências:

Data:	18/03/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Escoramento da fôrma dos pilares do 3º pavimento do Anexo 02:



	
Ocorrências:	

Data:	19/03/2026 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Visão geral da obra:  Anexo 02 – Visão geral da obra:



Anexo 01 – Montagem de fôrmas dos pilares da platibanda:



	Anexo 02 – Visão geral do 2º pavimento do Anexo 01 e taliscamento para reboco.  19/03/2026 09:22 Marabá  19/03/2026 09:24 Marabá
Ocorrências:	
Data:	20/03/2026 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Regularização e compactação do solo do estacionamento:  20/03/2026 07:59 Marabá

Anexo 01 – Vista frontal da obra e continuação da alvenaria da platibanda:



Anexo 02 – Regularização e compactação do solo do estacionamento:



Ocorrências:

Data:	21/03/2026 (sábado)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Regularização e compactação do solo do estacionamento: 

Anexo 01 – Escada concretada e desfôrma lateral.



Anexo 02 – Desfôrma dos pilares do 3º pavimento do Anexo 02:



Ocorrências:

Data:	23/03/2026 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Início da concretagem do piso de concreto do estacionamento:



Anexo 01 – Desfôrma de parte dos pilares da platibanda e continuação da alvenaria do perímetro externo da platibanda.



Anexo 02 – Montagem do escoramento e armação das vigas do 3º pavimento do Anexo 02:



Ocorrências:

Data:	24/03/2026 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Início da retirada de fôrma das vigas do 2º pavimento:  Anexo 02 – Montagem do escoramento e armação das vigas do 3º pavimento do Anexo 02:  Anexo 02 – Continuação da concretagem do piso de concreto do estacionamento: 



Ocorrências:	
--------------	--

Data:	25/03/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Proteção do perímetro das lajes com tela:  Anexo 02 – Continuação da concretagem do piso de concreto do estacionamento: 



	
Ocorrências:	

Data:	26/03/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da montagem do escoramento das vigas do 3º pavimento:  Anexo 02 – Continuação da concretagem do piso de concreto do estacionamento: 

	Anexo 01 – Continuação da alvenaria da platibanda:  26/03/2026 14:01 Marabá
Ocorrências:	

Data:	27/03/2026 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Montagem da armação das vigas do 3º pavimento:  27/03/2026 10:39 Marabá  27/03/2026 10:16 Marabá



Anexo 01 – Execução de contrapiso do pavimento superior:




Anexo 02 – Continuação da concretagem do piso de concreto do estacionamento:




	 27/03/2026 13:34 Marabá
Ocorrências:	

Data:	30/03/2026 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Montagem da armação das vigas do 3º pavimento:  30/03/2026 14:05

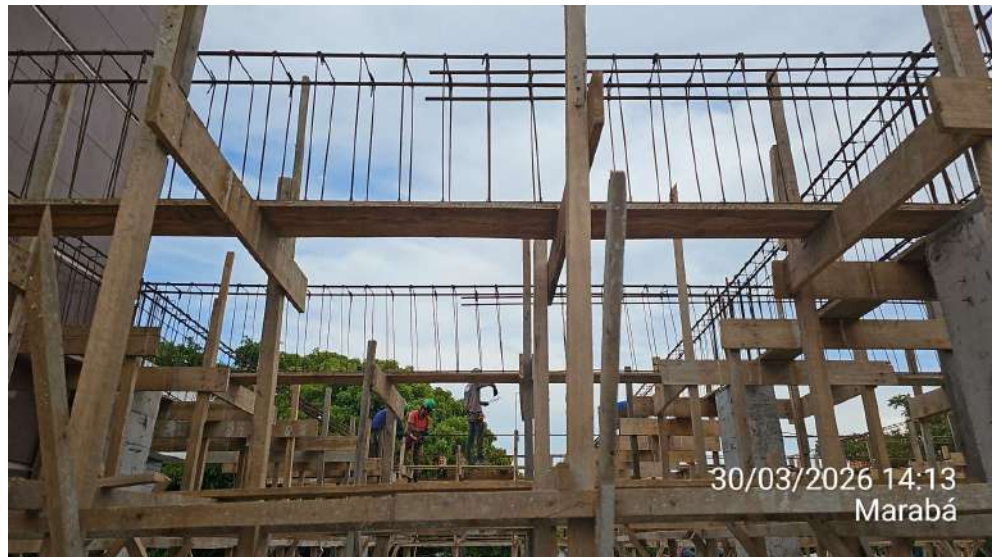



Anexo 01 – Execução de contrapiso do pavimento superior:

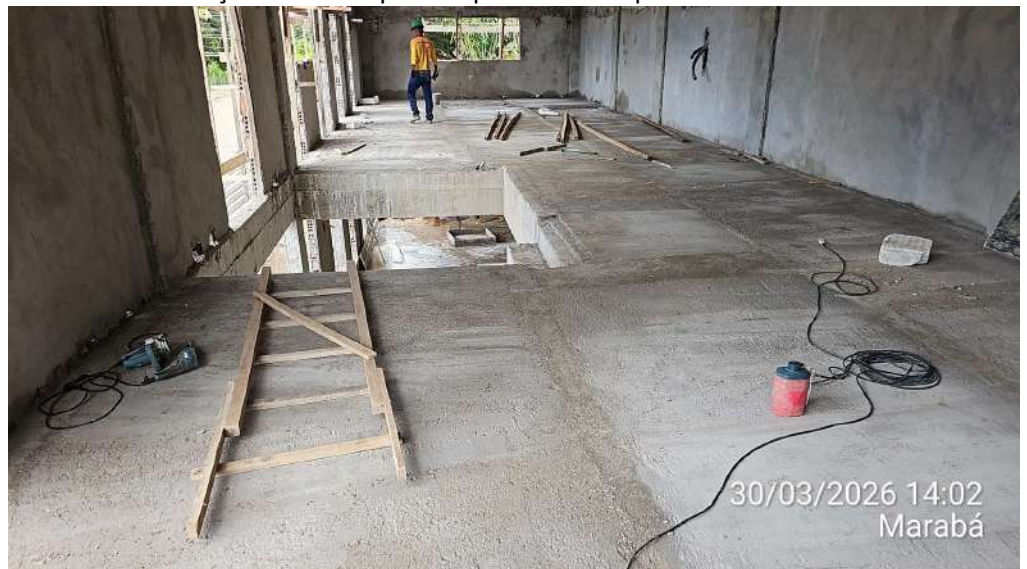

Anexo 02 – Continuação da concretagem do piso de concreto do estacionamento:



Anexo 01 – Continuação da alvenaria e concretagem de pilares da platibanda:



	
Ocorrências:	

Data:	31/03/2026 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Montagem da armação das vigas do 3º pavimento:  

	
Ocorrências:	

Data:	01/04/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Início da montagem das fôrmas das vigas do 3º pavimento:  Anexo 02 – Montagem da armação das vigas do 3º pavimento: 






Anexo 02 – Continuação da concretagem do piso de concreto do estacionamento:



Anexo 01 – Desforma das vigas da laje de cobertura do Anexo 01:



Anexo 01 - Continuação do reboco interno:

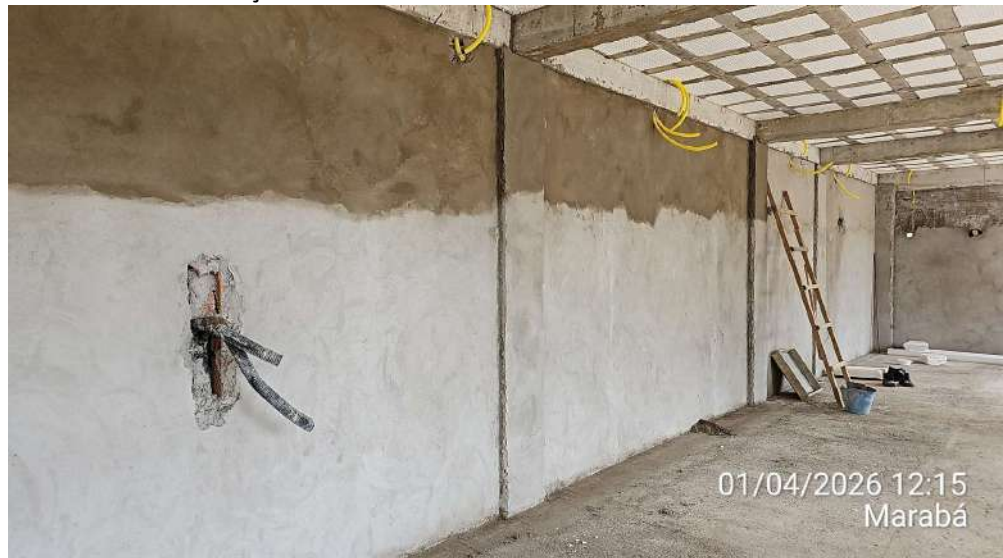

	Anexo 01 – Execução de parte de chapisco nas paredes da platibanda:  01/04/2026 12:20 Marabá
Ocorrências:	

Data:	06/04/2026 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Alvenaria e reboco de parte do 2º pavimento do Anexo 01:  06/04/2026 11:02 Marabá Anexo 01 – Visão geral da alvenaria e pilares da platibanda:  06/04/2026 11:05 Marabá



Ocorrências:	
Data:	07/04/2026 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Fixação de caixas octogonais e eletrodutos no teto do estacionamento:  Anexo 02 – Caixa enterradas para passagem de eletrodutos:



Anexo 02 – Reboco nova guarita:



Anexo 02 – Continuação da montagem das fôrmas das vigas do 3º pavimento (cobertura):



	
Ocorrências:	

Data:	08/04/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 2º pavimento: 



Anexo 02 – Instalação de eletrodutos entre caixas de passagem enterradas para alimentação do QGBT:





Ocorrências:	
--------------	--

Marabá/PA, 08 de abril de 2026.

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato
