



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)				
Objeto Contratual:	Contratação de empresa especializada para ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Marabá - Anexo I e Anexo II			
Contrato nº:	64/2025-CMM	Prazo de execução da obra:	Início: 06/10/2025	Previsão de Término: 06/10/2026
Empresa Contratada:	MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		Responsável Execução:	Rafael Ivo da Silva, Engenheiro Civil, CREA 1515086003PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ		Responsável Fiscalização:	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Lote/Anexo 01:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I			
Lote/Anexo 02:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II			
Período do RDO:	09/04/2026 a 08/05/2026		Endereço das obras:	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária do andamento das obras.

Data:	09/04/2026 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Passagem de fiação das luminárias e tomadas do estacionamento:  Anexo 02 – Concretagem e acabamento em calçada: 

Ocorrências:	
--------------	--

Data:	10/04/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Montagem de fôrma de vigas da cobertura:  Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 2º pavimento:  



Ocorrências:	

Data:	11/04/2026 (sábado)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 - Execução de instalação sanitária e caixa de passagem: 
Ocorrências:	

Data:	13/04/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Visão geral e continuação da montagem das fôrmas das vigas da cobertura:



Anexo 02 - Continuação da alvenaria do 2º pavimento:





Anexo 02 – Montagem da laje de cobertura e colocação do escoramento metálico:




Ocorrências:


Data:

14/04/2026 (terça-feira)

Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 - Instalação sanitária de lavabos:  14/04/2026 11:21 Marabá  14/04/2026 11:23 Marabá  14/04/2026 11:22 Marabá  14/04/2026 11:23 Marabá Anexo 01 – Retirada do restante de fôrmas e escoras da escada:

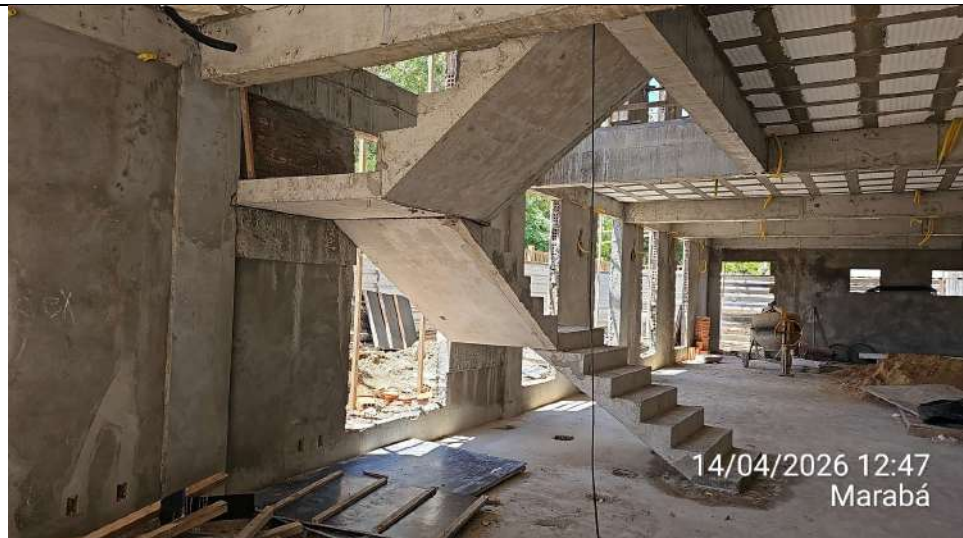

Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 2º pavimento:

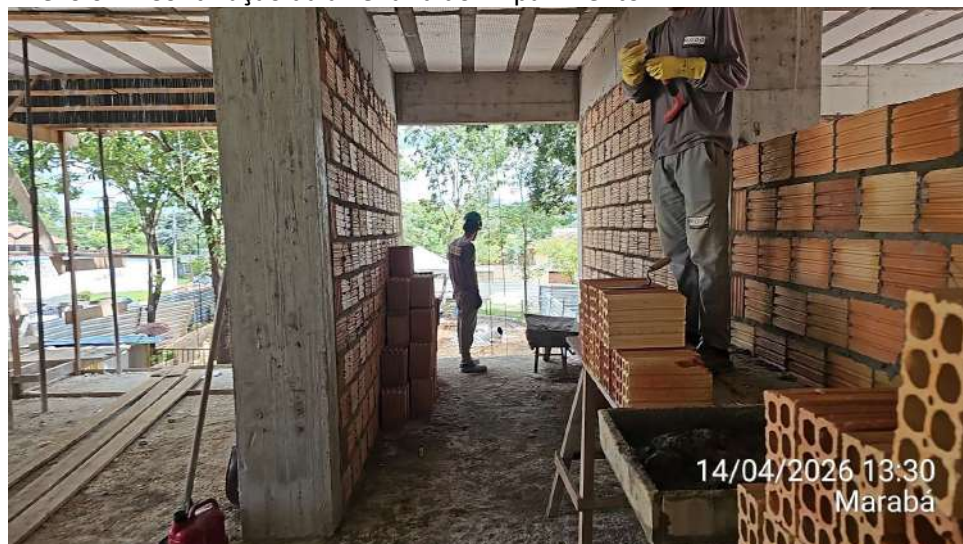




	 
Ocorrências:	

Data:	15/04/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 - Continuação da laje e escoramento metálico: 

Anexo 02 – Montagem de fôrmas inferiores da calha e marquise de concreto armado:



Anexo 01 – Rasgos de alvenaria para passagem de eletrodutos de elétrica e rede lógica:

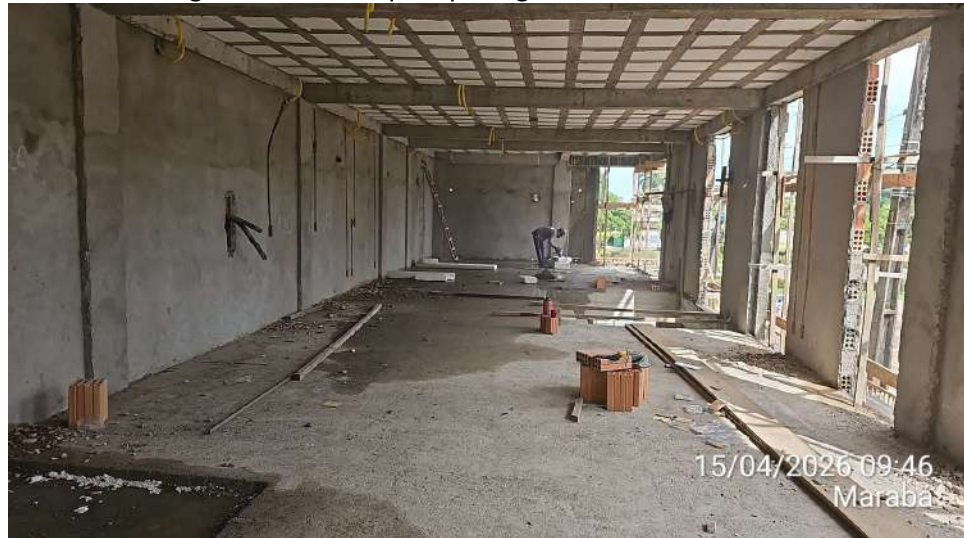



Anexo 01 – Continuação da montagem de fôrmas das vigas superiores:




Ocorrências:

Data:	16/04/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Chumbamento das caixinhas de elétrica e rede lógica nas paredes de alvenaria:



Anexo 01 – Acabamentos/requadro de vãos do pavimento térreo:

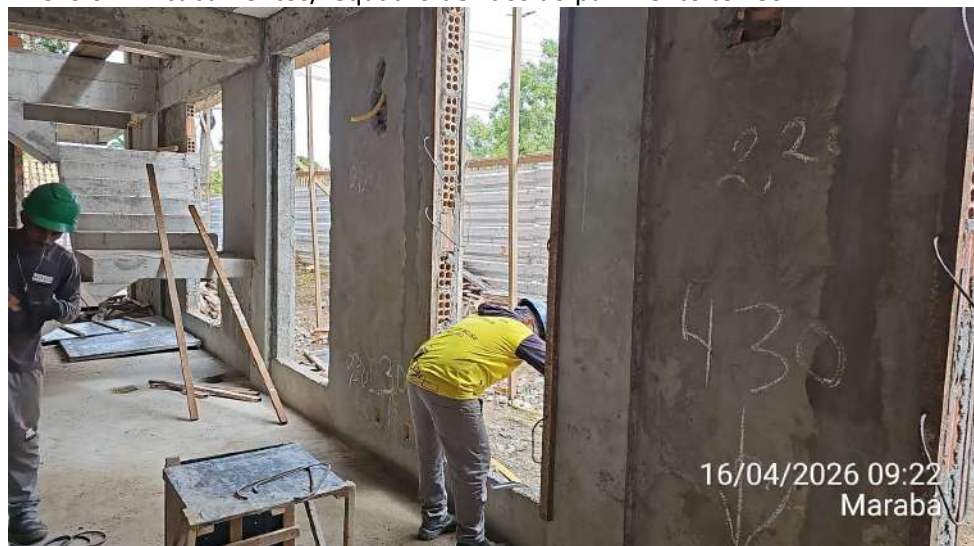

Anexo 02 – Contrapiso do guarita, depósito e banheiro:



Ocorrências:

Data:	17/04/2026 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 2º pavimento: 

Anexo 01 – Instalação de eletrodutos em rasgos de alvenaria para elétrica e rede lógica.



Anexo 02 – Chapisco em alvenaria e verga de porta.



Ocorrências:

Data:	20/04/2026 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 2º pavimento:

Ocorrências:	

Data:	22/04/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 2º pavimento:

Ocorrências:

Anexo 02 – Visão geral da obra.



Data:

23/04/2026 (quinta-feira)

Clima:

Nublado

Atividades realizadas:

Anexo 02 – Instalação de esgoto:



Anexo 02 – Continuação da montagem da laje de cobertura e das armação da marquise que contorna a laje:





Anexo 02 – Visão da fachada posterior e avanço da obra.



Ocorrências:

Data:	24/04/2026 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da montagem da laje de cobertura e das armação da marquise que contorna a laje e continuação da alvenaria:



	
Ocorrências:	

Data:	27/04/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Início do forro de gesso do estacionamento:  Anexo 01 – Chapisco e reboco das paredes internas da cobertura: 

Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 2º pavimento e chapisco.



Anexo 02 - Continuação da montagem da laje da cobertura:



Ocorrências:

Data:	29/04/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Confeção de vergas e contravergas:



	
Ocorrências:	

Data:	30/04/2026 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Visão geral da obra do Anexo 02:  Anexo 01 – Visão geral da obra do Anexo 01: 


Anexo 02 – Confeção de vergas e contravergas:



Anexo 02 – Armação da laje de cobertura com calhas e marquise:





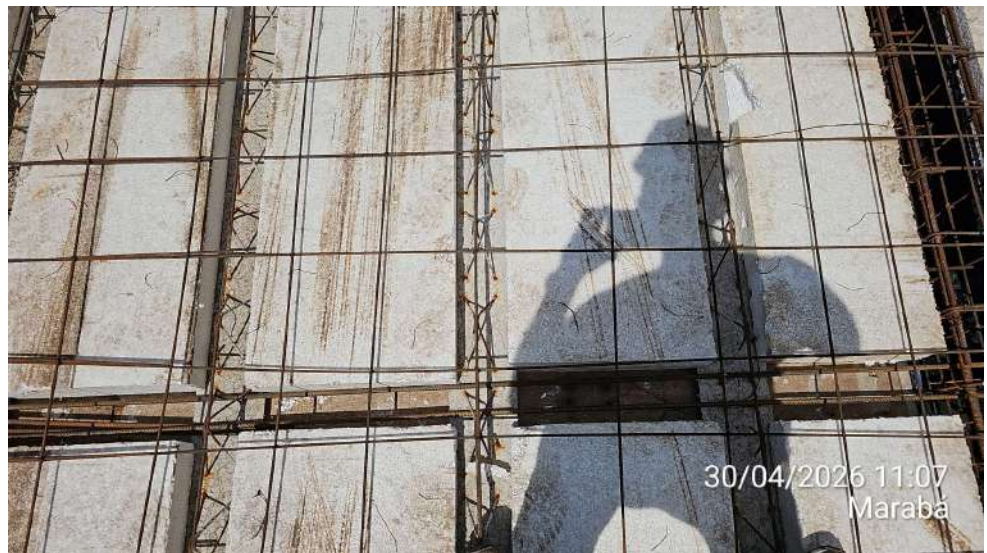


Anexo 02 – Continuação do forro de gesso do estacionamento:



	
Ocorrências:	

Data:	04/05/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Início do reboco interno do 2º pavimento: 
Ocorrências:	

Data:	05/05/2026 (terça-feira)
Clima:	Nublado e chuva parcial
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do reboco interno do 2º pavimento:

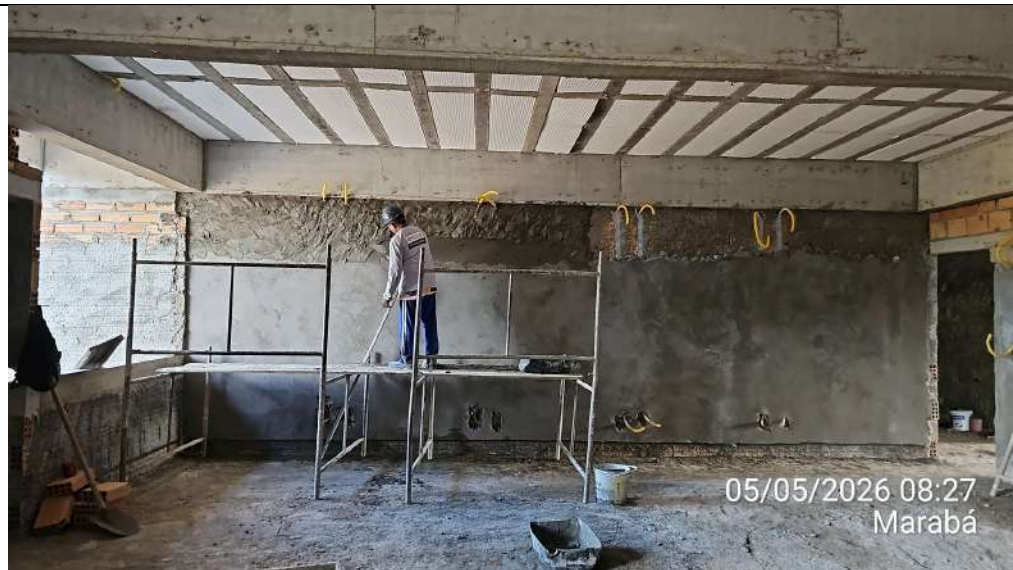

Anexo 02 – Continuação do forro de gesso do estacionamento:





Anexo 02 – Concretagem da laje de cobertura:



Ocorrências: Informo que durante a concretagem da laje houve chuva..

Data:	06/05/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – rasgos em alvenaria para passagem de eletrodutos:  Anexo 02 – Passagem de eletrodutos em alvenaria:  Anexo 02 – Cura da laje de cobertura:



Anexo 02 – Reboco do lado interno da alvenaria do 2º pavimento:



Ocorrências:

Data: 07/05/2026 (quinta-feira)

Clima: Sol

Atividades realizadas: Anexo 02 – rasgo em alvenaria para passagem de eletrodutos:





Anexo 02 – Cura da laje de cobertura:



Anexo 02 - Confecção de verga para janela:



Anexo 01 – Visão geral



Anexo 02 - confecção de caixa de inspeção para esgoto:



Ocorrências:

Data:	08/05/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – chumbamento de eletrodutos e reboco interno do 2º pavimento :



Anexo 02 -- Continuação da alvenaria do 2º pavimento:



Anexo 02 – forro de gesso do estacionamento:





	Anexo 02 – Cura da laje de cobertura e transporte vertical de materiais: 
Ocorrências:	Informo que houve visita técnica dos técnicos da Vale e do MPPA para aferição in loco da medição do mês de abril.

Marabá/PA, 08 de maio de 2026.

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato
