



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)				
Objeto Contratual:	Contratação de empresa especializada para ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Marabá - Anexo I e Anexo II			
Contrato nº:	64/2025-CMM	Prazo de execução da obra:	Início: 06/10/2025	Previsão de Término: 06/10/2026
Empresa Contratada:	MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		Responsável Execução:	Rafael Ivo da Silva, Engenheiro Civil, CREA 1515086003PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ		Responsável Fiscalização:	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Lote/Anexo 01:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I			
Lote/Anexo 02:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II			
Período do RDO:	06/12/2025 até 06/01/2026	Endereço das obras:	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA	


Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária do andamento das obras.

Data:	06/12/2025 (sábado)
Clima:	Chuva
Atividades realizadas:	Visão geral da obra do Anexo 02, com valas cheias de água devido às chuvas fortes da manhã: 
Ocorrências:	Ocorrência de chuvas intensas pela manhã e chuva mais fraca e nublado pelo resto do dia.

Data:	08/12/2025 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Limpeza da cabeça das estacas:



Continuação do posicionamento da armadura:

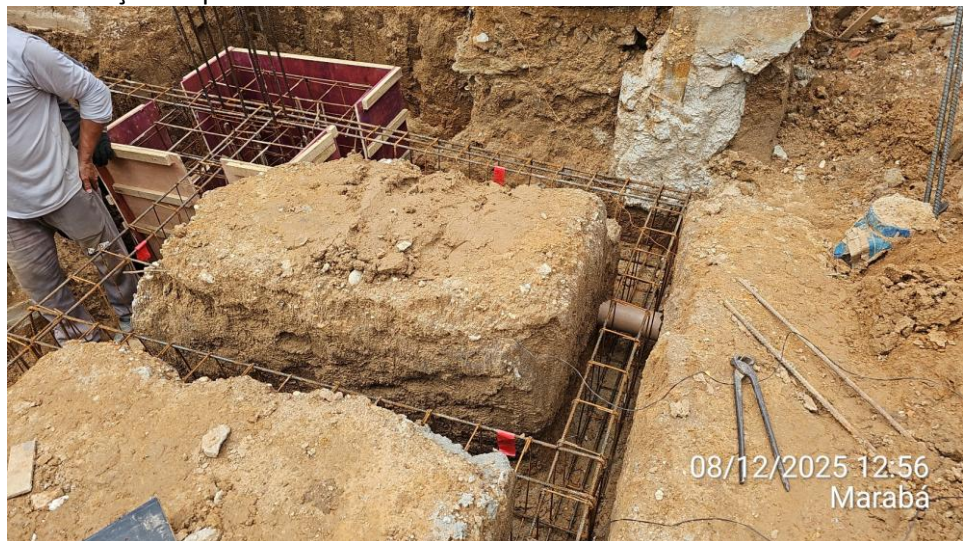

Amarração de fôrmas:



Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame:





Adensamento de concreto:




Lançamento e adensamento de concreto:





Visão geral de vigas e blocos concretados:

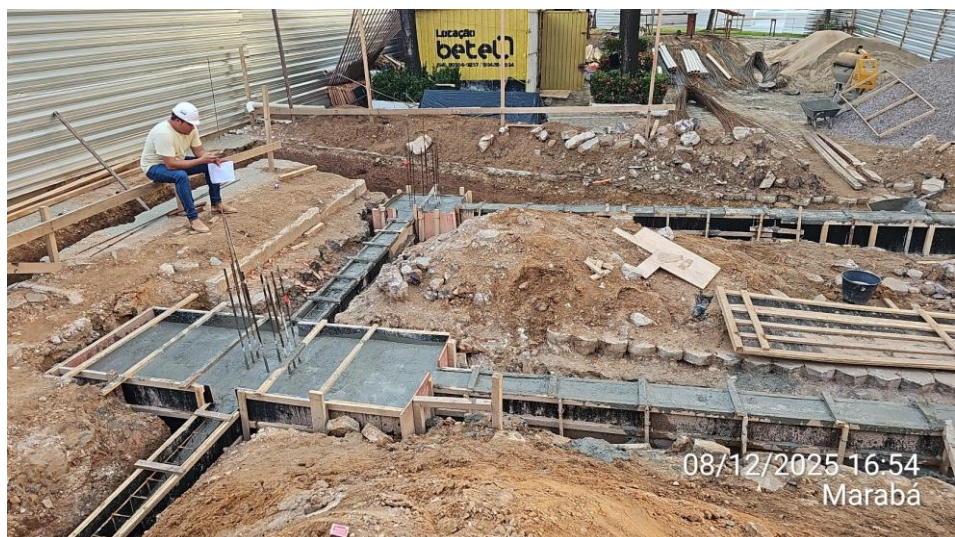



Finalização da concretagem:



Ocorrências:

Data:	09/12/2025 (terça-feira)
Clima:	Chuva pela manhã e nublado o restante do dia
Atividades realizadas:	Visão geral da obra do Anexo 02 os blocos e vigas baldrame concretados e parte da armadura dos pilares posicionadas:







Novos tubos de água pluvial e esgoto, ligação com prédio existente:




Treliças da 1ª laje do Anexo 01:



	Isopor da 1ª laje do Anexo 01:  09/12/2025 14:26 Marabá Corpos de prova da concretagem dos blocos e vigas baldrame do Anexo 02:  09/12/2025 14:36 Marabá
Ocorrências:	

Data:	10/12/2025 (quarta-feira)
Clima:	Nublado e sol
Atividades realizadas:	Continuação do posicionamento das armaduras dos pilares do pavimento inferior (estacionamento):  10/12/2025 08:56 Marabá

Concretagem de pilares do pavimento térreo do Anexo 01:

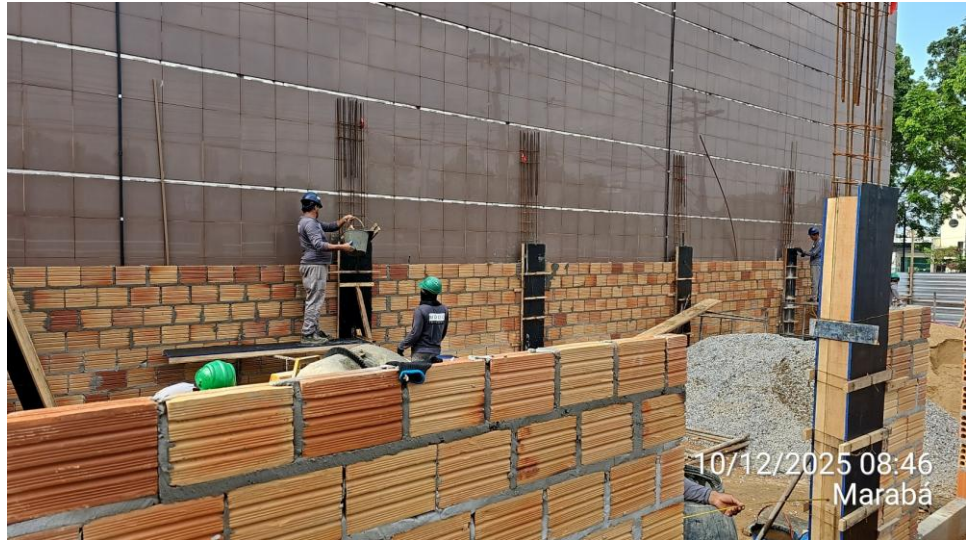

Continuação de assentamento de alvenaria do Anexo 01:




Ocorrências:



Data:	11/12/2025 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação de desforma das vigas baldrame e blocos do Anexo 02:  Continuação de posicionamento de armadura de pilares do pavimento inferior (estacionamento):  Visão geral da obra do Anexo 01: 



Escoramento de fôrmas de pilares do Anexo 01:

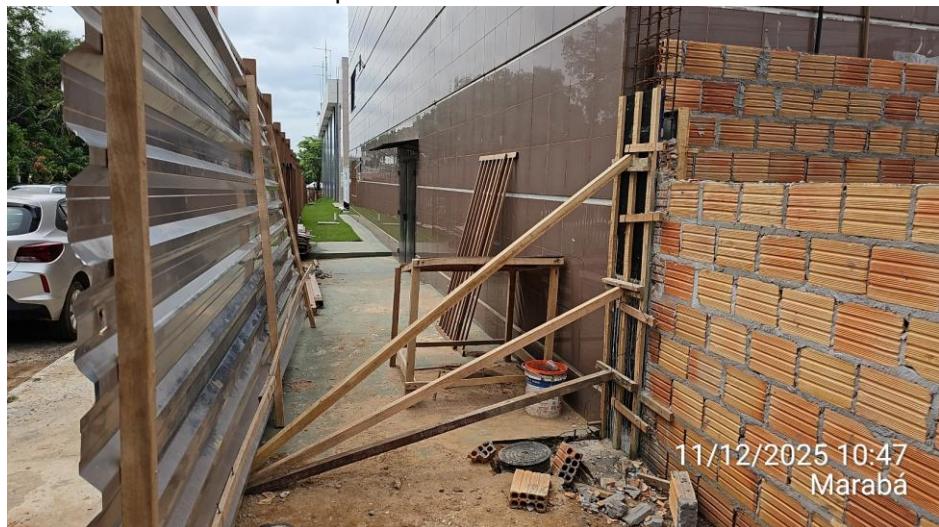


Ocorrências:



Data:	12/12/2025 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação de desforma das vigas baldrame e blocos do Anexo 02:  12/12/2025 09:27 Marabá Início do posicionamento das fôrmas dos pilares do pavimento inferior (estacionamento):  12/12/2025 15:47 Marabá  12/12/2025 15:47 Marabá

Escoramento de fôrmas de pilares do Anexo 01:

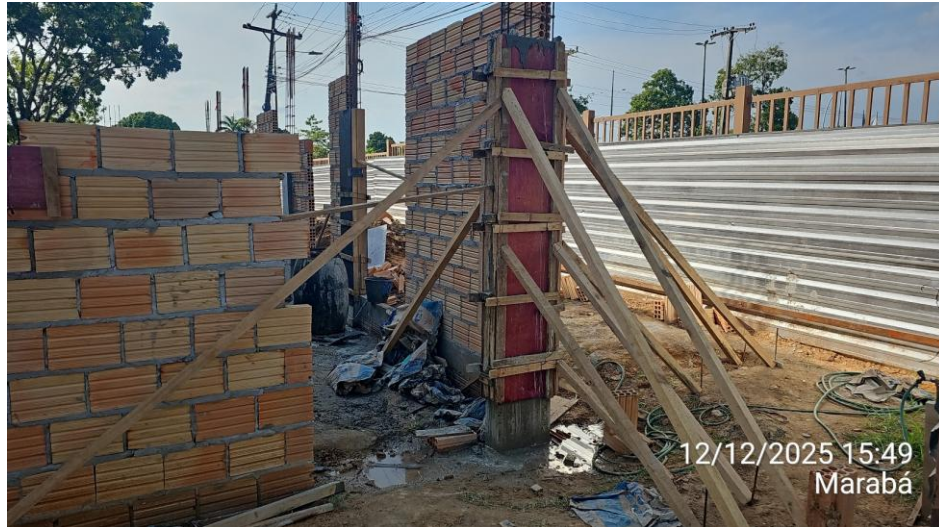

Continuação da alvenaria da obra do Anexo 01:



Confecção de contra-verga moldada in loco:



Ocorrências:

Data:	13/12/2025 (sábado)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação de desforma das vigas baldrame e blocos do Anexo 02 e continuação do posicionamento das fôrmas dos pilares do pavimento inferior (estacionamento):  13/12/2025 09:09 Marabá Desforma de pilares do Anexo 01 e detalhe da superfície adensada:  13/12/2025 09:16 Marabá  13/12/2025 09:16 Marabá

Visão geral da obra do Anexo 01:



Baldrame desformatado do Anexo 02:





Superfície de bloco de coroamento do Anexo 02, mostrando o resultado do adensamento:



Ocorrências:

Data:	15/12/2025 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação da desforma do baldrame e montagem de fôrma de pilares do Anexo 02:



Impermeabilização de blocos e vigas baldrame do Anexo 02:



Desforma de pilares da obra do Anexo 01:



Superfície da base do pilar:



Ocorrências:

Data:	16/12/2025 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação da impermeabilização de blocos e vigas baldrame do Anexo 02: 





Desforma de contra-verga e levante de alvenaria da obra do Anexo 01:






	Início dos escoramentos das vigas do pavimento superior da obra do Anexo 01: 
Ocorrências:	

Data:	17/12/2025 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Visão geral da obra Anexo 02 com retirada de restante de fôrmas de vigas baldrame e colocação das “gravatas” nas fôrmas dos pilares: 
	Desforma de verga e levante de alvenaria da obra do Anexo 01:




	 17/12/2025 09:01 Marabá
Ocorrências:	

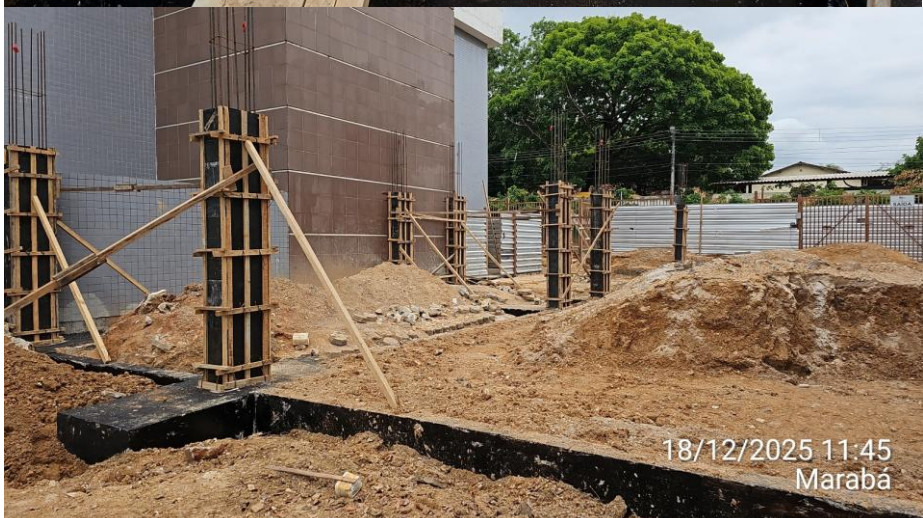
Data:	18/12/2025 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Visão geral da obra Anexo 02 com travamento das fôrmas dos pilares:  18/12/2025 11:45  18/12/2025 11:45 Marabá Reaterro de valas no entorno das vigas baldrame e blocos da obra do Anexo 02:



Anexo 01 – Colocação do escoramento para vigas e andaimes:

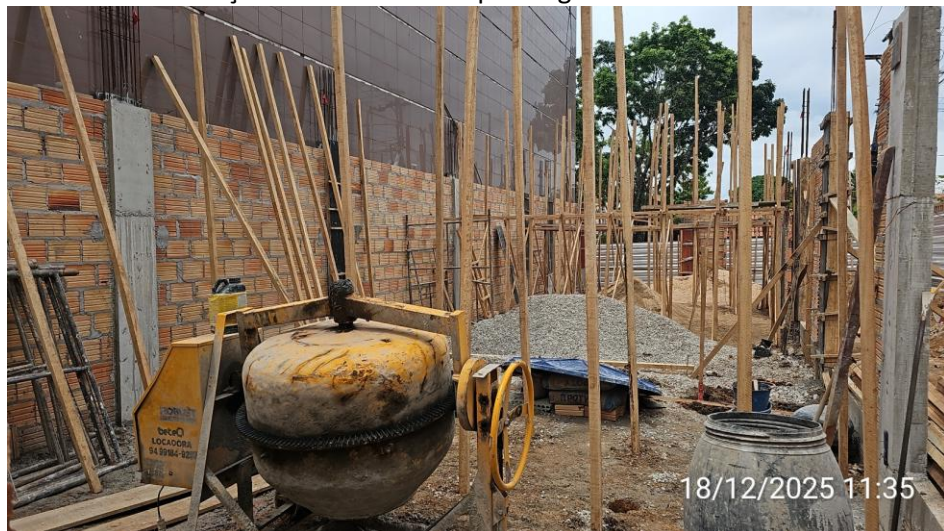

Anexo 01 – Continuação de alvenaria:

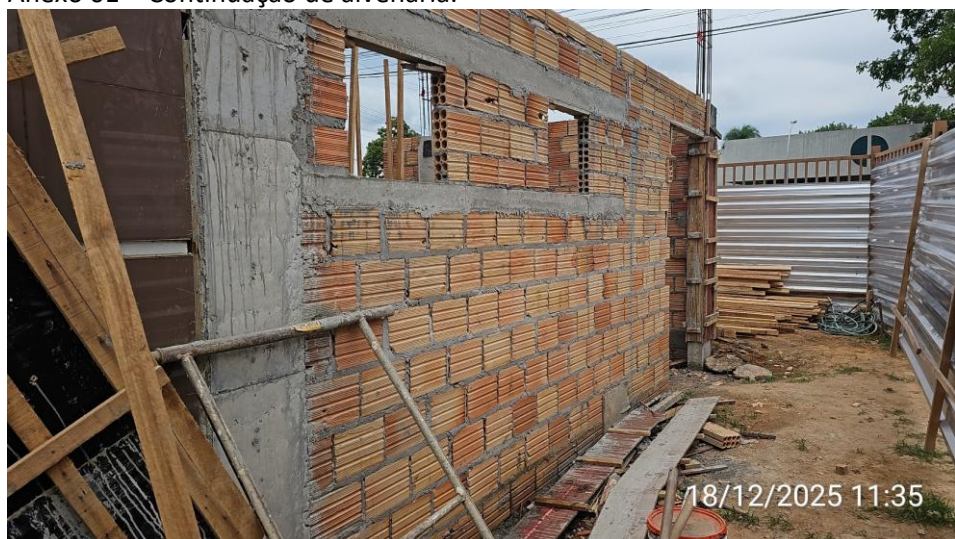

Ocorrências:

Data:


19/12/2025 (sexta-feira)



Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Visão geral da obra Anexo 02 com travamento das fôrmas dos pilares:  Anexo 01 – Início do posicionamento de armação de vigas superiores:  



Anexo 02 – Concretagem dos pilares do pavimento inferior (estacionamento) com lançamento e adensamento:

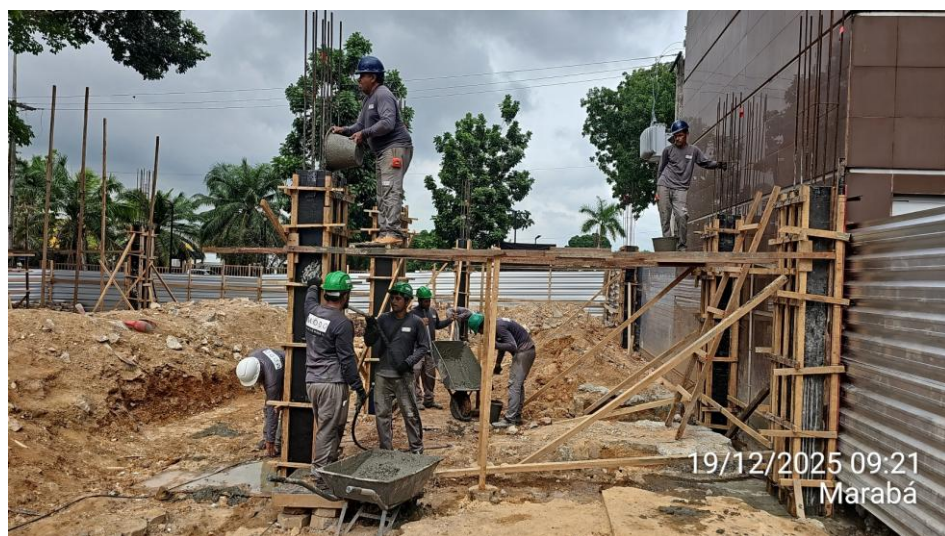




Ocorrências:

Data: 20/12/2025 (sábado)

Clima: Nublado

Atividades realizadas: Anexo 01 – Continuação do posicionamento da armação das vigas superiores:

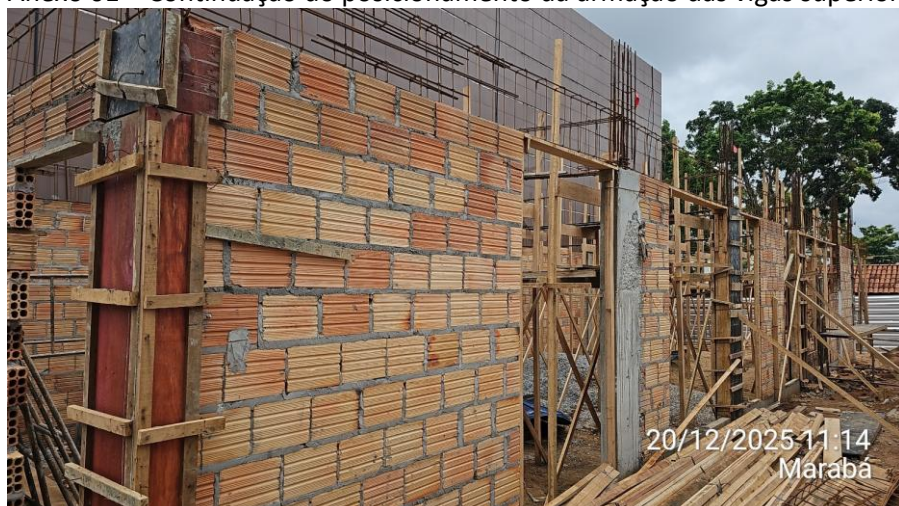



Ocorrências:	

Data:	22/12/2025 (segunda-feira)
Clima:	Chuva
Atividades realizadas:	
Ocorrências:	Chuva nas obras.


Data:	23/12/2025 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Reaterro no entorno de vigas baldrame utilizando bota-fora da obra do Anexo 02:  23/12/2025 14:08 Marabá
Ocorrências:	

Data:	24/12/2025 (quarta-feira) a 28/12/2025 (domingo)
Clima:	-
Atividades realizadas:	
Ocorrências:	Recesso dos funcionários da empresa devido ao Natal e final do ano.

Data:	29/12/2025 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Desforma de pilares do pavimento inferior (estacionamento):



Anexo 01 – Colocação dos fundos de viga (fôrmas) das vigas superiores:

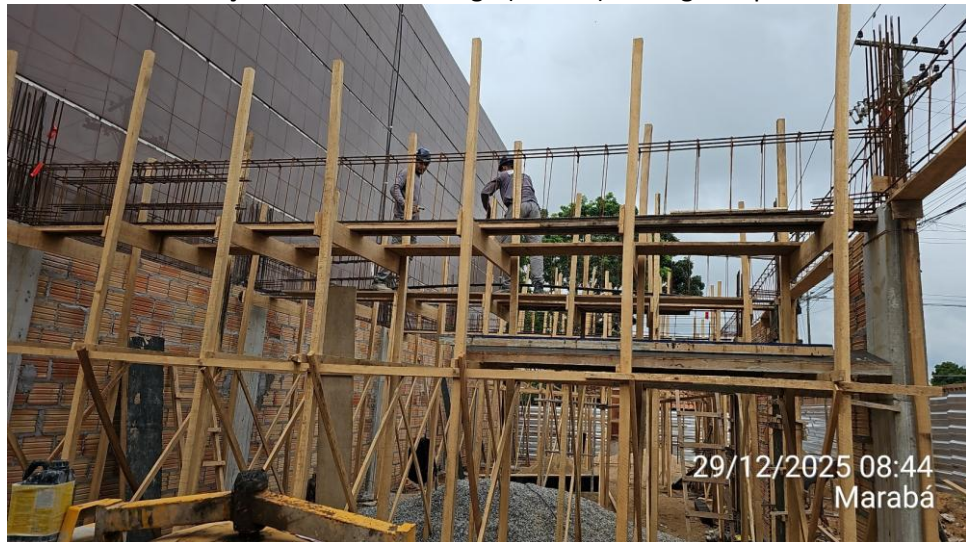

Ocorrências: Retorno às atividades da obra.

Data: 30/12/2025 (terça-feira)

Clima: Sol

Atividades realizadas: Anexo 02 – Pilares desformados do pavimento inferior (estacionamento):






	Anexo 01 – Colocação das laterais das fôrmas das vigas superiores: 
Ocorrências:	

Data:	31/12/2025 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação da montagem das fôrmas das vigas superiores.
Ocorrências:	Expediente até 12h (último dia do ano).


Data:	01/01/2026 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	
Ocorrências:	Feriado

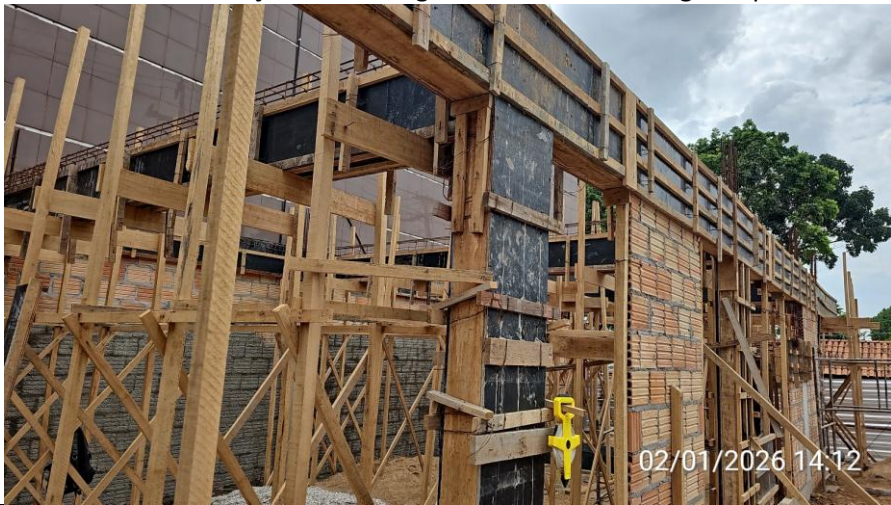Data:	02/01/2026 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação da montagem das fôrmas das vigas superiores: 
Ocorrências:	



Data:	03/01/2026 (sábado)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação da montagem das fôrmas das vigas superiores e aplicação de chapisco em parte das paredes do pavimento térreo: 
Ocorrências:	

Data:	05/01/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Montagem das fôrmas das nervuras da laje superior:  Anexo 01 – Posicionamento de armação de vigas na fachada frontal:

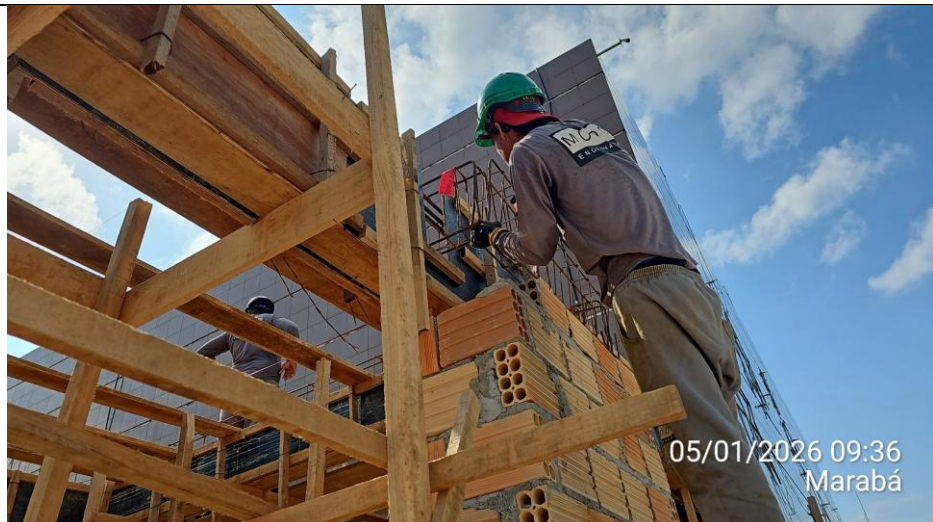

Anexo 01 – Concretagem de vigas de apoio de patamares intermediários da escada:



Ocorrências:

Data:	06/01/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Montagem de escoramento das vigas superiores da 1ª laje: 



	Anexo 01 – Continuação da montagem das fôrmas das nervuras da laje superior: 
Ocorrências:	Visita de técnicos da Vale para aferição dos serviços executados na 3ª medição das obras.

Marabá/PA, 06 de janeiro de 2026.

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato
