



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)				
Objeto Contratual:	Contratação de empresa especializada para ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Marabá - Anexo I e Anexo II			
Contrato nº:	64/2025-CMM	Prazo de execução da obra:	Início: 06/10/2025	Previsão de Término: 06/10/2026
Empresa Contratada:	MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		Responsável Execução:	Rafael Ivo da Silva, Engenheiro Civil, CREA 1515086003PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ		Responsável Fiscalização:	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Lote/Anexo 01:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I			
Lote/Anexo 02:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II			
Período do RDO:	05/11/2025 até 05/12/2025	Endereço das obras:	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA	

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária do andamento das obras.

Data:	05/11/2025 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Escavação das vigas baldrame do Anexo 01: 



Escavação dos blocos de coroamento do Anexo 02:



Ocorrências:

Data:

06/11/2025 (quinta-feira)



Clima:	Chuva e nublado
Atividades realizadas:	Continuação da escavação das vigas baldrame do Anexo 01:   



Continuação da escavação dos blocos de coroamento do Anexo 02, mas o excesso de água nas valas não permitiu o avanço dos trabalhos:



Ocorrências: Devido à chuva, o andamento das obras foi impactado.



Data:	07/11/2025 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação da escavação das vigas baldrame do Anexo 01:  07/11/2025 08:45 Marabá  07/11/2025 14:21 Marabá  07/11/2025 08:49 Marabá

Retirada de bota-fora e entulho proveniente da escavação das vigas baldrame do Anexo 01:



Armação das vigas baldrame do Anexo 01 finalizadas:



Armação finalizada dos pilares do pavimento inferior do Anexo 02:





Obras do Anexo 02, ainda com solo encharcado:



Ocorrências: A última chuva ainda afetou os trabalhos na obra do Anexo 02:

Data:	08/11/2025 (sábado)
Clima:	Nublado



**Atividades
realizadas:**

Continuação da escavação das vigas baldrame do Anexo 01:



Retirada de bota-fora e entulho proveniente da escavação das vigas baldrame do Anexo 01:



Continuação da escavação dos blocos do Anexo 02:





Montagem e fôrmas para vigas baldrame das obras:



Ocorrências:

Data:	10/11/2025 (segunda-feira)
Clima:	Chuvisco pela manhã e nublado no restante do dia
Atividades realizadas:	Produção de concreto magro do Anexo 01: 

Ampliação do concreto magro das vigas baldrame e blocos do Anexo 01:





Continuação da escavação das vigas baldrame do Anexo 01:



Corte e colocação de portão provisório na entrada do prédio da Câmara:



	
Ocorrências:	

Data:	11/11/2025 (terça-feira)
Clima:	Nublado com sol parcial
Atividades realizadas:	Produção de concreto magro do Anexo 01:  Colocação das armaduras das vigas baldrame e blocos de coroamento do Anexo 01: 



Continuação da retirada de entulho/bota-fora do Anexo 01:



Continuação da escavação dos blocos de coroamento da obra do Anexo 02:






Ocorrências:

Data:	12/11/2025 (quarta-feira)
Clima:	Nublado com chuvisco pela manhã

**Atividades
realizadas:**

Colocação das armaduras das vigas baldrame e blocos de coroamento do Anexo 01:

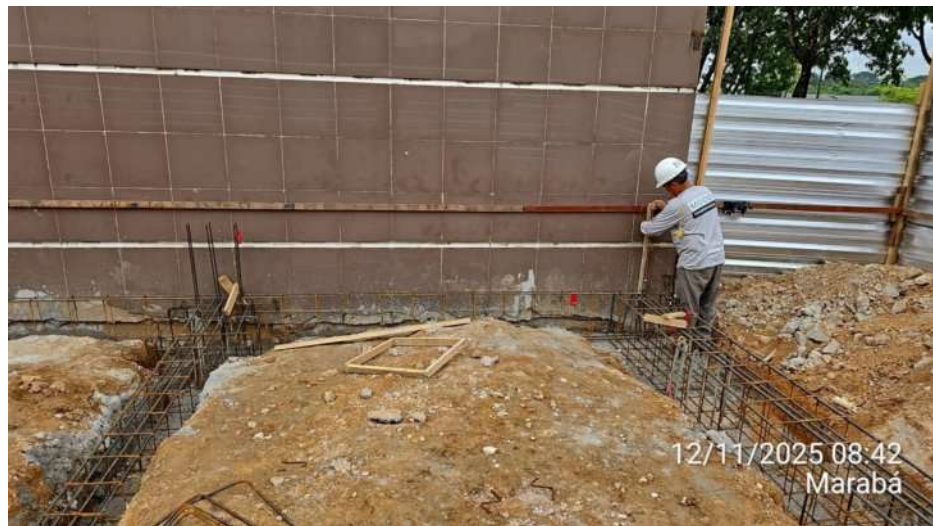



Continuação da retirada de entulho/bota-fora do Anexo 01:



Continuação da escavação dos blocos de coroamento da obra do Anexo 02:







	
Ocorrências:	

Data:	13/11/2025 (quinta-feira)
Clima:	Nublado com chuvisco pela manhã
Atividades realizadas:	Colocação das armaduras das vigas baldrame e blocos de coroamento do Anexo 01: 


Continuação da escavação dos blocos de coroamento da obra do Anexo 02:



	
Ocorrências:	

Data:	14/11/2025 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Colocação da armação das esperas da escada do Anexo 01:  Confecção de argamassa: 

Montagem das fôrmas das vigas baldrame e blocos de coroamento do Anexo 01:

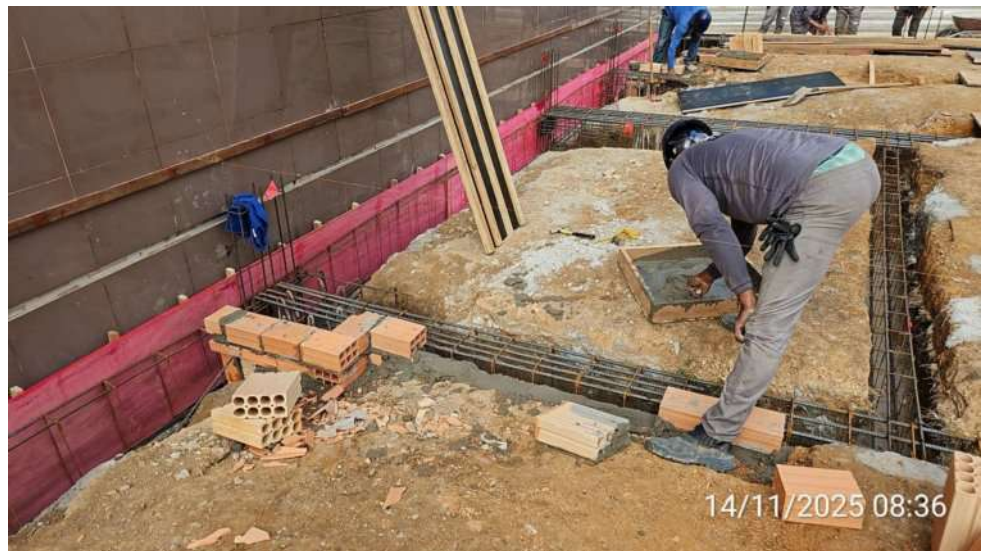

Continuação da escavação dos blocos de coroamento e vigas baldrame da obra do Anexo 02:




Ocorrências:

Data:	15/11/2025 (sábado)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Colocação de armação em vigas do Anexo 01:



Montagem das fôrmas das vigas baldrame e blocos de coroamento do Anexo 01:

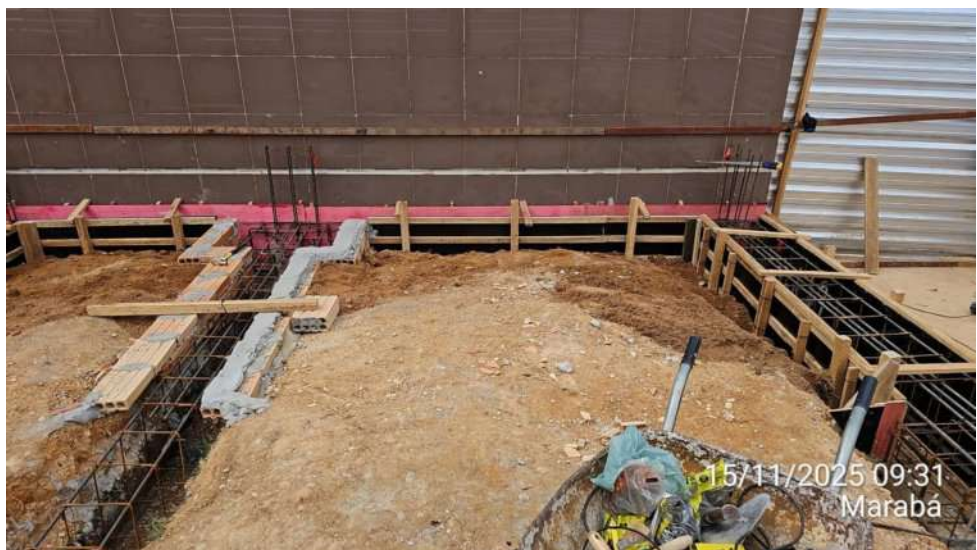

Continuação da escavação dos blocos de coroamento e vigas baldrame da obra do Anexo 02:



Ocorrências:

Data:	17/11/2025 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Continuação da escavação dos blocos de coroamento e vigas baldrame da obra do Anexo 02:



Retirada de bloquete sextavado do estacionamento e escavação das vigas baldrame da obra do Anexo 02:



Fixação de eletrodutos verticalmente entre os dois prédios para passagem de cabos de cobre nu do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da obra do Anexo 01:




Aterramento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da obra do Anexo 01:



Ocorrências:

Data:	18/11/2025 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Retirada de bloquete sextavado do estacionamento e escavação das vigas baldrame da obra do Anexo 02:

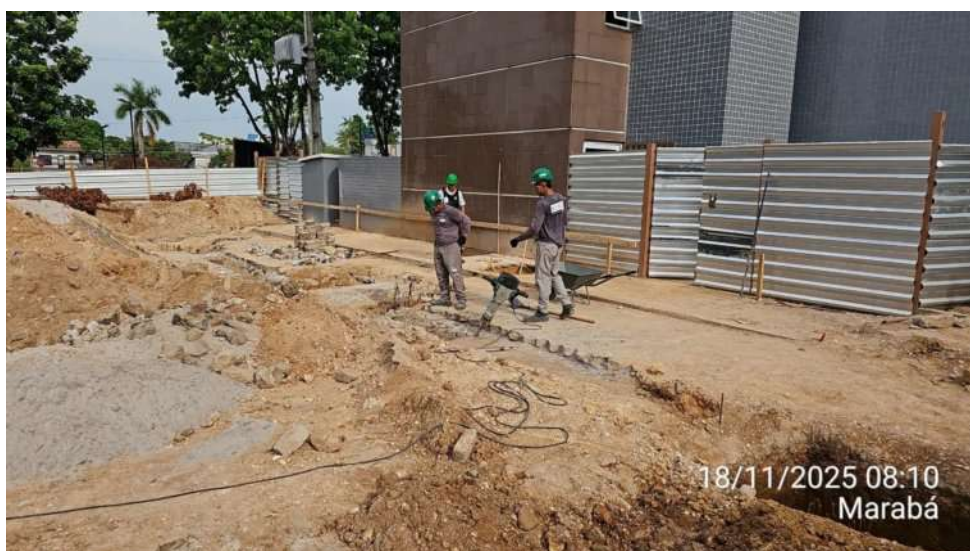

Passagem de cabos de cobre nu da malha de aterramento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da obra do Anexo 01:





	
Ocorrências:	

Data:	19/11/2025 (quarta-feira)
Clima:	Nublado pela manhã e sol pela tarde
Atividades realizadas:	Continuação da escavação das vigas baldrame e blocos da obra do Anexo 02: 



Haste de aterramento interligando malha do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da obra do Anexo 01:



Concretagem dos blocos e vigas baldrame da obra do Anexo 01:




Lançamento e adensamento de concreto nas vigas baldrame da obra do Anexo 01:





Visão geral após a concretagem dos blocos e vigas baldrame da obra do Anexo 01:

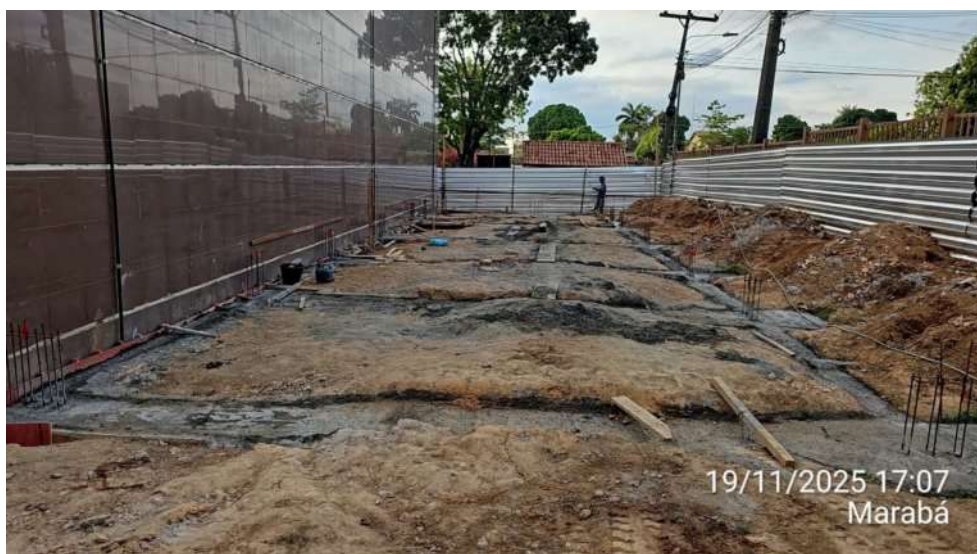

Ocorrências:



Data:	20/11/2025 (quinta-feira)
Clima:	Chuva pela manhã e nublado a tarde.
Atividades realizadas:	Continuação da escavação das valas para esgoto e água pluvial.  Continuação da escavação das vigas baldrame e blocos da obra do Anexo 02:  Impermeabilização de vigas baldrame e blocos do Anexo 01:



Desforma de vigas baldrame e blocos:





	
Ocorrências:	Chuva pela manhã.

Data:	21/11/2025 (sexta-feira)
Clima:	Nublado pela manhã e sol pela tarde
Atividades realizadas:	Continuação da escavação das valas para esgoto e água pluvial.  Continuação da escavação das vigas baldrame e blocos da obra do Anexo 02:



Posicionamento da armadura dos pilares do pavimento térreo do Anexo 01:



Continuação da impermeabilização das vigas baldrame do Anexo 01:





Montagem de fôrma para contraverga de dos vãos da fachada lateral:



Instalação de tubulação de drenos de ar condicionados:



Escavação e aterramento para malha de cobre nu do sistema de proteção contra descargas atmosféricas:



Corte e aterro entre as vigas baldrame:





Ocorrências:	
--------------	--

Data:	22/11/2025 (sábado)
Clima:	Nublado pela manhã e sol pela tarde
Atividades realizadas:	Área de carpintaria, montagem de fôrmas das vigas baldrame de blocos das obras:  Fôrma das vigas baldrame, montadas:  Contraverga e base dos pilares concretada – Anexo 01.



Início da alvenaria com a primeira fiada de tijolos e tubulação de espera para drenos de ar condicionado que ficaram do lado do prédio existente:




Ocorrências:

Data:	24/11/2025 (segunda-feira)
Clima:	Nublado pela manhã e sol pela tarde
Atividades realizadas:	Continuação da escavação das vigas baldrame e blocos do Anexo 02:



Continuação da alvenaria do Anexo 01:

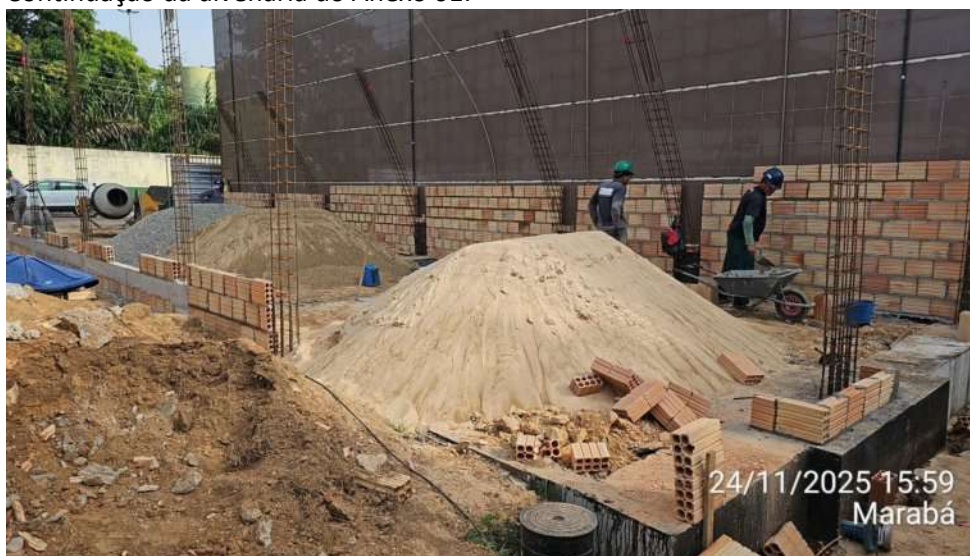

Confecção de argamassa de assentamento para alvenaria:



	 24/11/2025 08:22 Marabá
Ocorrências:	

Data:	25/11/2025 (terça-feira)
Clima:	Nublado pela manhã e sol pela tarde
Atividades realizadas:	Continuação da fabricação de fôrmas das vigas baldrame e blocos do Anexo 02:  25/11/2025 08:00 Marabá Lançamento e nivelamento do concreto magro para as vigas baldrame e blocos do Anexo 02:



Continuação da escavação das vigas baldrame e blocos do Anexo 02:



Ocorrências:

Data:	26/11/2025 (quarta-feira)
Clima:	Nublado pela manhã e sol pela tarde
Atividades realizadas:	Continuação do lançamento e nivelamento do concreto magro para as vigas baldrame e blocos do Anexo 02:



Continuação da escavação das vigas baldrame e blocos do Anexo 02 e demolição de calçada com martelete:



Assentamento de fiada de alvenaria para nivelar a base das vigas baldrame:





	Continuação da alvenaria do Anexo 01:  26/11/2025 15:15
Ocorrências:	

Data:	27/11/2025 (quinta-feira)
Clima:	Nublado pela manhã e sol pela tarde
Atividades realizadas:	Continuação da escavação das vigas baldrame e blocos do Anexo 02:  27/11/2025 09:22 Marabá



Assentamento de fiada de alvenaria para nivelar a base das vigas baldrame:



Posicionamento da armadura dos blocos de coroamento do Anexo 02:





Continuação da alvenaria do Anexo 01:



Ocorrências:

Data:	28/11/2025 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação da escavação das vigas baldrame e blocos do Anexo 02:



Continuação do posicionamento da armadura dos blocos e vigas baldrame do Anexo 02:



Continuação da alvenaria do Anexo 01:



Retirada e entulho e bota-fora do Anexo 01:



Caixa coletora de entulho:



Ocorrências:

Data:	29/11/2025 (sábado)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação da escavação das vigas baldrame e blocos do Anexo 02:  Continuação do posicionamento da armadura dos blocos e vigas baldrame do Anexo 02:  Posicionamento das fôrmas dos blocos e baldrame do Anexo 02:



Ocorrências:

Data:	01/12/2025 (segunda-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação da escavação e posicionamento da armadura dos blocos e vigas baldrame do Anexo 02:



Posicionamento das fôrmas dos blocos e baldrame do Anexo 02:



Confecção de fôrmas dos blocos e vigas baldrame do Anexo 02:



Armação dos pilares do pavimento térreo do Anexo 02 já montadas:



Armadura de vigas do Anexo 02, já montadas:



Fôrmas do pilares do pavimento térreo montadas, obra do Anexo 01:



Ocorrências:

Data:	02/12/2025 (terça-feira)
Clima:	Chuvisco e nublado
Atividades realizadas:	Continuação da escavação e posicionamento da armadura dos blocos e vigas baldrame do Anexo 02:  Continuação do posicionamento das fôrmas dos blocos e baldrame do Anexo 02:  Continuação da escavação para desvio da tubulação de esgoto e pluvial do Anexo 02 e retirada de entulho:



Ocorrências: Visita da equipe técnica da Vale às obras.

Data: 03/12/2025 (quarta-feira)

Clima: Chuva pela manhã e nublado a tarde

Atividades realizadas: Continuação da escavação e posicionamento da armadura dos blocos e vigas baldrame do Anexo 02:



Continuação do posicionamento das fôrmas dos blocos e baldrame do Anexo 02:



Continuação da escavação para desvio da tubulação de esgoto e pluvial do Anexo 02 e retirada de entulho:



Valas dos blocos com acúmulo de água da chuva que ocorreu nesta manhã:



Ocorrências: Informo que a chuva desta manhã impactou no andamento da obra do Anexo 02, deixando o solo mole e as valas dos blocos com água.

Data:	04/12/2025 (quinta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Continuação da escavação dos blocos e vigas baldrame do Anexo 02:



Retirada de entulho (bota-fora) do Anexo 02:



Continuação do posicionamento das fôrmas dos blocos e baldrame do Anexo 02:



Instalação da tubulação de 150mm de esgoto e pluvial do Anexo 02 do lado posterior do prédio, onde foi necessário realizar o serviço para não prejudicar o funcionamento do prédio existente:



Reaterro das valas de esgoto e água pluvial:



Final do coletor de esgoto instalado até à fossa existente:



Armaduras de bloco de viga baldrame do Anexo 02:



	
Ocorrências:	

Data:	05/12/2025 (sexta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Montagem de fôrmas e concreto magro do Anexo 02:  Concreto magro das vigas baldrame do Anexo 02: 



Valas escavadas das vigas baldrame da guarita do Anexo 02:




Armaduras de viga baldrame do Anexo 02:



Visão geral das fôrmas e armações montadas do Anexo 02:



Visão geral do Anexo 01, com parte da alvenaria executada, armadura dos pilares do térreo posicionadas e com fôrmas instaladas:

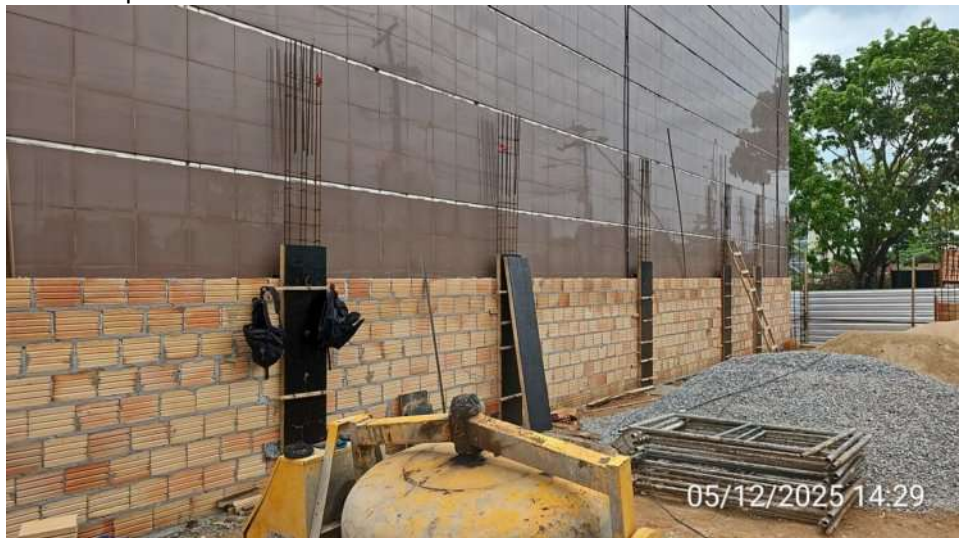

Ocorrências: Visita de técnico da Vale às obras para a 2ª medição.



CÂMARA
MUNICIPAL
DE MARABÁ

Marabá/PA, 05 de dezembro de 2025.

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato
