CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)					
Objeto Contratual:	Contratação de empresa especializada para ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Marabá - Anexo I e Anexo II				
Contrato nº:	64/2025-CMM	**Prazo de execução da obra:**	**Início:** 06/10/2025		**Previsão de Término:** 06/10/2026
Empresa Contratada:	MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			**Responsável Execução:**	Rafael Ivo da Silva, Engenheiro Civil, CREA 1515086003PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ			**Responsável Fiscalização:**	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Lote/Anexo 01:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I				
Lote/Anexo 02:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II				
Período do RDO:	09/05/2026 a 03/06/2026		**Endereço das obras:**	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA	

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária do andamento das obras.

Data:	09/05/2026 (sábado)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do forro do estacionamento:  Anexo 02 – Cura da laje de cobertura:

	
Ocorrências:	

Data:	11/05/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do reboco interno do 2º pavimento .

	
Ocorrências:	

Data:	12/05/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Concretagem das laterais da calha e marquise da cobertura: 





Anexo 02 – Gesso das vigas do estacionamento:



Ocorrências:	

Data:	13/05/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Montagem de portais do 2º pavimento.  Anexo 02 – Continuação do forro de gesso do estacionamento:  Anexo 02 – Continuação da concretagem das laterais da calha de concreto e marquise da laje de cobertura:



Anexo 02 – Continuação do reboco interno do 2º pavimento:



Anexo 02 – Cura da laje de cobertura:



Ocorrências:	

Data:	14/05/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Chapisco e reboco interno do 2º pavimento e início da alvenaria da platibanda do edifício:   Anexo 02 – Visão geral em relação ao prédio existente:

	 Anexo 02 – Confecção de portais para portas do 2º pavimento: 
Ocorrências:	

Data:	15/05/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da alvenaria da platibanda do edifício: 



Anexo 02 – Continuação do forro de gesso do estacionamento:



Anexo 02 – Confecção de portais para portas do 2º pavimento:



Anexo 02 – Hidráulica dos lavabos do 2º pavimento:









Anexo 02 – Chumbamento de caixas 4x2” para energia, lógica, TV e som no 2º pavimento:



Anexo 02 – Acabamento de vãos de janelas do 2º pavimento:



Anexo 02 – Continuação da concretagem das laterais da calha de concreto armado e marquises da laje de cobertura:




Anexo 02 – Remoção de entulho proveniente da obra em geral:



Anexo 02 – Chapisco de paredes:



Anexo 02 – Início do contrapiso do 2º pavimento:

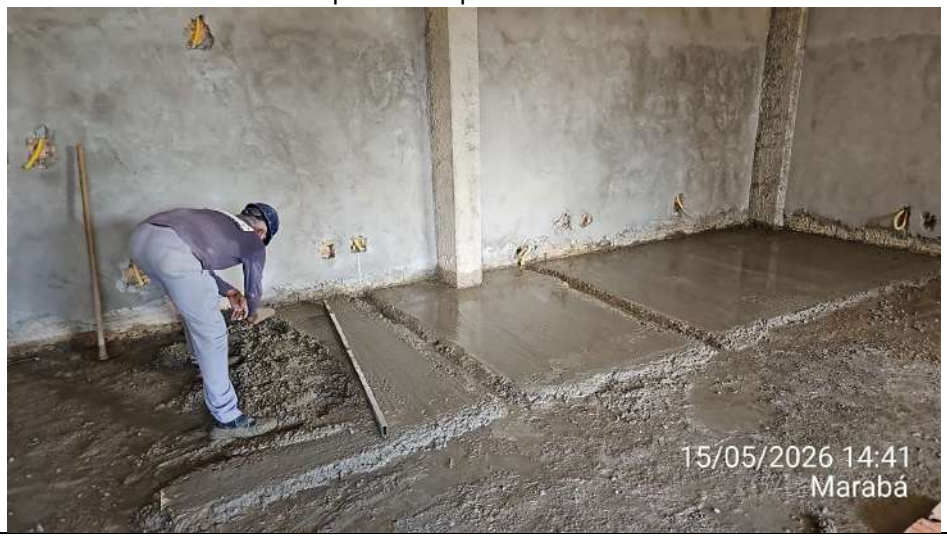

Ocorrências:	

Data:	18/05/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do chumbamento de caixas 4x2” na alvenaria:  Anexo 02 – Continuação do contrapiso do 2º pavimento: 

	 Anexo 02 – Hidráulica de lavabo do 2º pavimento: 
Ocorrências:	

Data:	20/05/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do forro do estacionamento: 

	Anexo 02 – Continuação do contrapiso do 2º pavimento:  Anexo 02 – Chumbamento de portais do 2º pavimento: 
Ocorrências:	

Data:	21/05/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Refazimento da tubulação de esgoto do banheiro devido a entupimento com argamassa: 

Ocorrências:	

Data:	22/05/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Confecção de vergas para vãos do 2º pavimento:  Anexo 01 – Montagem da estrutura metálica das paredes de drywall do Anexo 01: 

	 Anexo 01 - Remoção de entulho proveniente da obra em geral: 
Ocorrências:	

Data:	25/05/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Montagem da estrutura metálica e fechamento das paredes de drywall do Anexo 01:







Anexo 02 – Continuação do forro do estacionamento:



Anexo 02 – Chapisco do corredor do Anexo 02 e chumbamento de portais:



Anexo 02 – Chumbamento de caixas 4x2”:




Anexo 01 – Encanação de esgoto do banheiro do pavimento superior do Anexo 01:



Anexo 01 – Acabamentos e vergas dos vãos:



Anexo 01 – Continuação da alvenaria da parede dos fundos:

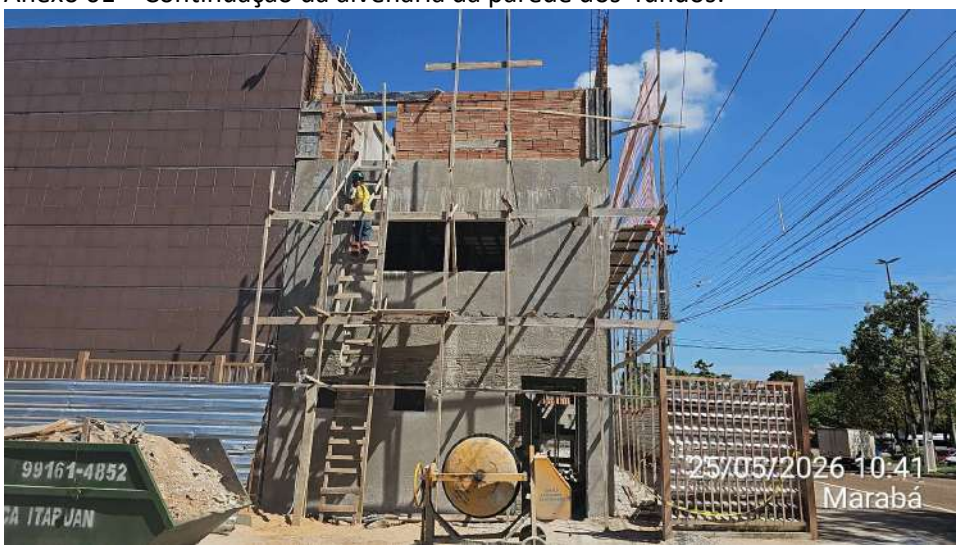

Ocorrências:	

Data:	26/05/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 -Continuação da alvenaria da parede dos fundos com chapisco: 
Ocorrências:	

Data:	27/05/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação de acabamento do 2º pavimento: 



Anexo 02 – Passagem de eletrodutos no contrapiso:



Anexo 02 – Continuação do reboco do 2º pavimento:



Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 3º pavimento:







Anexo 02 – Encunhamento com argamassa:



Anexo 02 -Desforma das laterais da calha e marquise da platibanda:





Anexo 01 – Chumbamento de quadro de força:



Anexo 01 – Fixação de caixas de passagem na laje e passagem de eletrodutos no teto:









Anexo 01 – Fixação de caixas 4x2” nas paredes drywall:

	 Anexo 01 – Escavação de vala para ramal de esgoto que conectará o esgoto do prédio existente com o do Anexo 01: 
Ocorrências:	

Data:	29/05/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do forro do 2º pavimento: 

Ocorrências:	


Data:	01/05/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Visão geral da fachada frontal da obra:  Anexo 01 - Instalação de estrutura metálica e pendurais para receber o forro de drywall: 
Ocorrências:	

Data:	02/05/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Chapisco e reboco de lajes do 2º pavimento:



Anexo 01 – Colocação de tubulação de 100mm e reaterro de vala para conexão do esgoto do Anexo 01 com o esgoto existente:



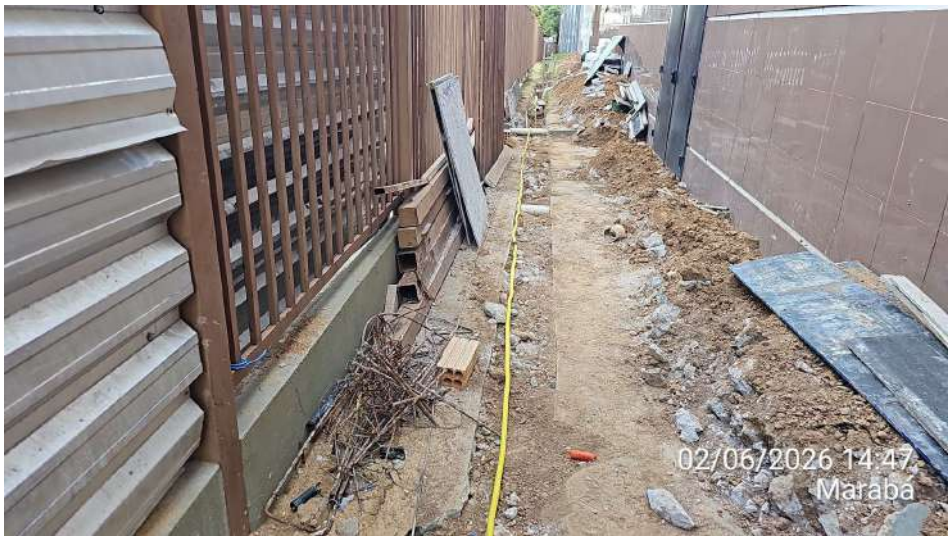


Anexo 01 – Continuação da instalação de esgoto aéreo do Anexo 01 (banheiro superior e copa):










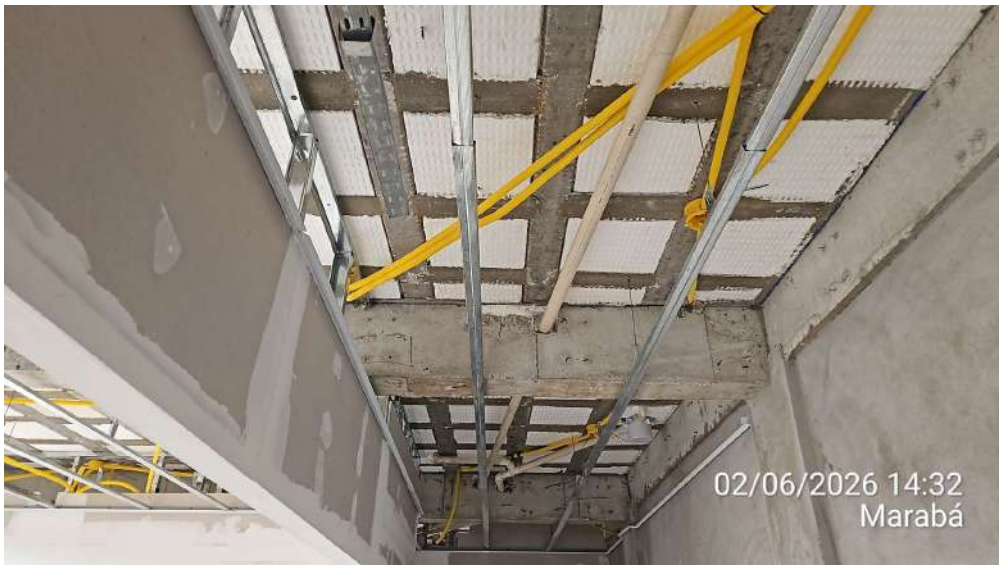

Anexo 01 – Instalação de eletrocalha para cabeamento rede:

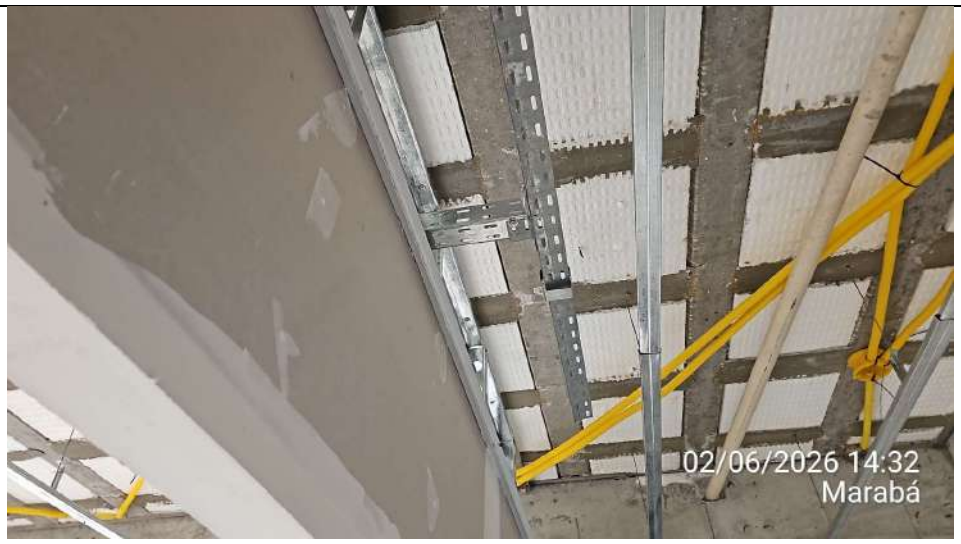


02/06/2026 14:32
Marabá


02/06/2026 14:32
Marabá


02/06/2026 14:33
Marabá



Anexo 01 – Tratamento de juntas das paredes drywall:






02/06/2026 14:37
Marabá


02/06/2026 14:37
Marabá


02/06/2026 14:38
Marabá



Anexo 01 – Passagem de eletrodutos, caixas e instalação de estrutura para receber o forro de drywall:



Anexo 02 – Continuação do forro de gesso do estacionamento e aplicação de gesso desempenado nas vigas:







Anexo 02 – Fechamento externo uma lateral em alvenaria:



Anexo 02 – Continuação do reboco do corredor do 2º pavimento:



Anexo 02 – Encanação de um lavabo do 3º pavimento:



Anexo 02 -Desforma de vigas e chapisco de alvenaria do 3º pavimento:






Anexo 02 – Chapisco e reboco de lavados e depósitos do 2º pavimento:




02/06/2026 15:01
Marabá


02/06/2026 15:01
Marabá

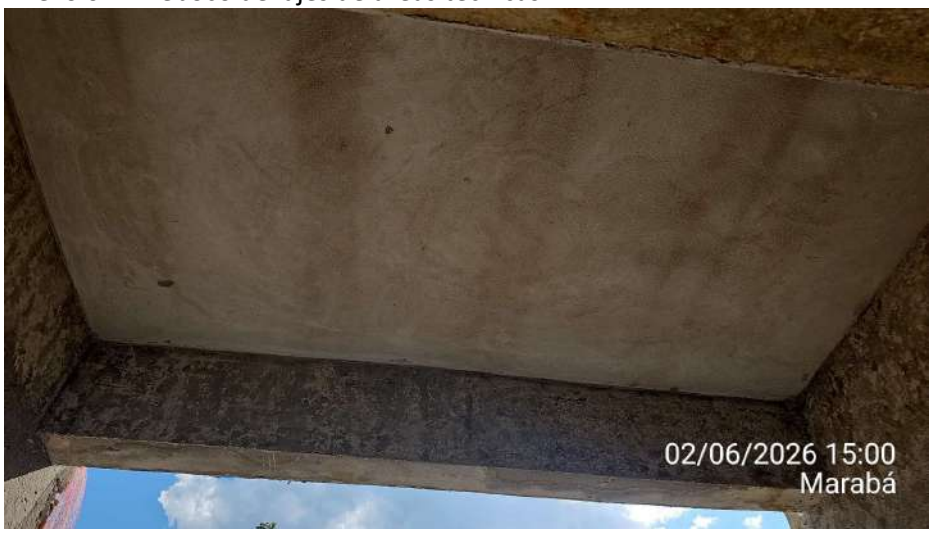	Anexo 02 – Acabamentos em vãos:  Anexo 02 – Reboco de lajes de áreas técnicas:  
Ocorrências:	

Data:	03/05/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação da encanação de esgoto do Anexo 01 bem como das paredes em drywall: Anexo 02 – Continuação de alvenaria e chapisco do 3º pavimento:
Ocorrências:	Informo que houve visita do técnico da Vale para aferição in loco da medição do mês de maio.

Marabá/PA, 07 de junho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
WALISON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 07/06/2026 15:06:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato
