CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)					
Objeto Contratual:	Contratação de empresa especializada para ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Marabá - Anexo I e Anexo II				
Contrato nº:	64/2025-CMM	**Prazo de execução da obra:**	**Início:** 06/10/2025		**Previsão de Término:** 06/10/2026
Empresa Contratada:	MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			**Responsável Execução:**	Rafael Ivo da Silva, Engenheiro Civil, CREA 1515086003PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ			**Responsável Fiscalização:**	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Lote/Anexo 01:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I				
Lote/Anexo 02:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II				
Período do RDO:	04/06/2026 a 08/07/2026		**Endereço das obras:**	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA	

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária do andamento das obras.

Data:	05/06/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do forro do estacionamento: 





Anexo 02 – Chapisco de lajes:




Anexo 02 – Contrapiso de lajes técnicas:





Anexo 02 – Continuação da desfôrma de vigas da laje de cobertura:

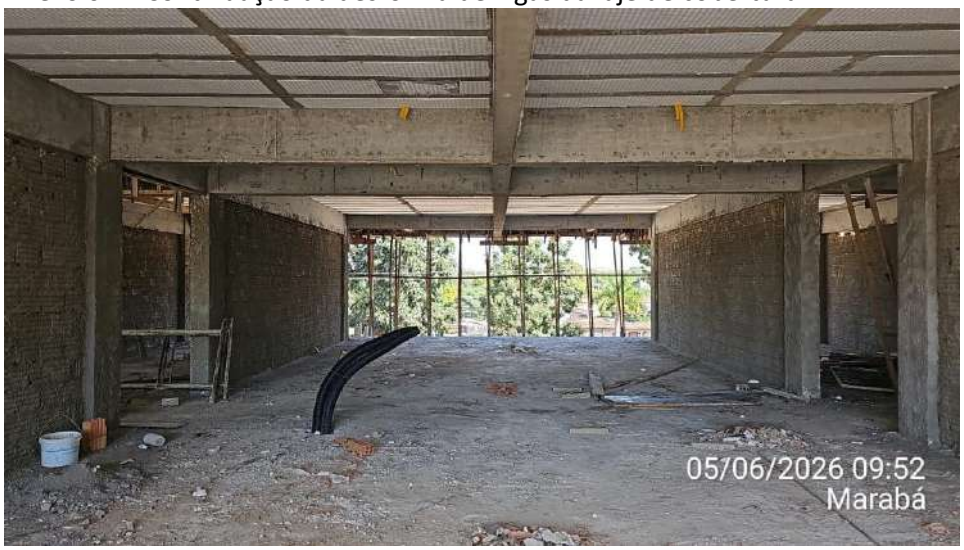

Anexo 02 – Marcação e montagem de divisórias de drywall dos gabinetes do 2º pavimento:






Anexo 02 – Reboco interno de caixas hidráulicas enterradas:



Ocorrências:	

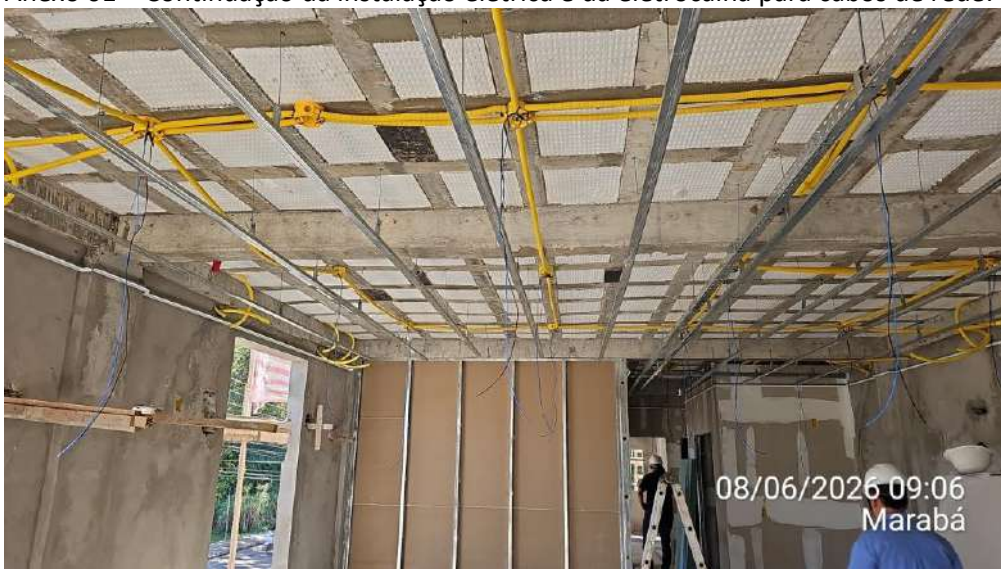Data:	08/06/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação da instalação elétrica e da eletrocalha para cabos de rede: 
Ocorrências:	

Data:	09/06/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Esgoto de lavabo do 3º pavimento: 



Anexo 02 – Alvenaria e chapisco das paredes do 3º pavimento:







Anexo 02 – Continuação da alvenaria da platibanda do telhado:







Anexo 01 – Assentamento de granito nos peitoris de esquadrias:










Anexo 01 – Passagem de eletrodutos de rede lógica:




Anexo 01 – Eletrocalha instalada e passagem de cabos de rede lógica:


09/06/2026 15:34
Marabá


09/06/2026 15:35
Marabá

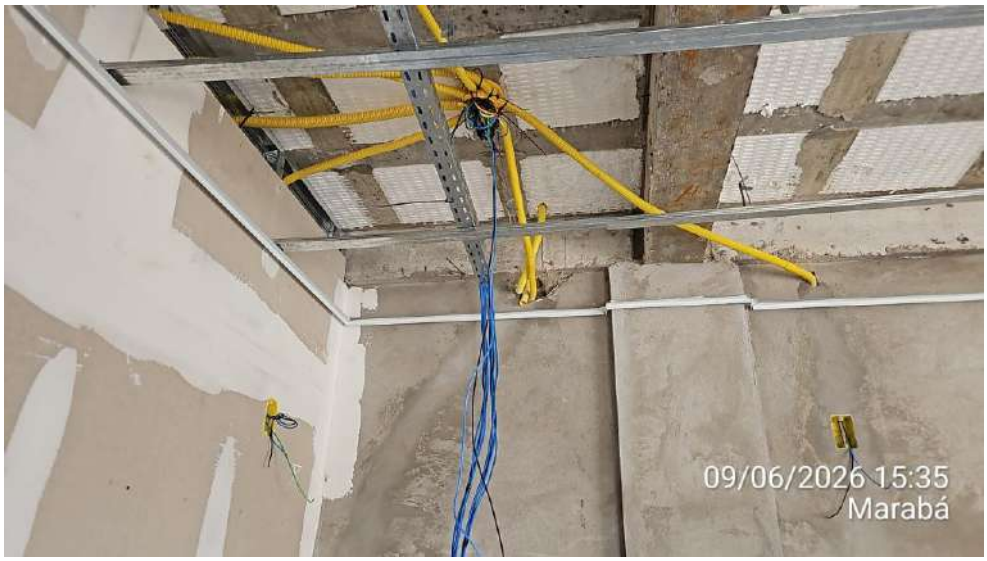
09/06/2026 15:35
Marabá

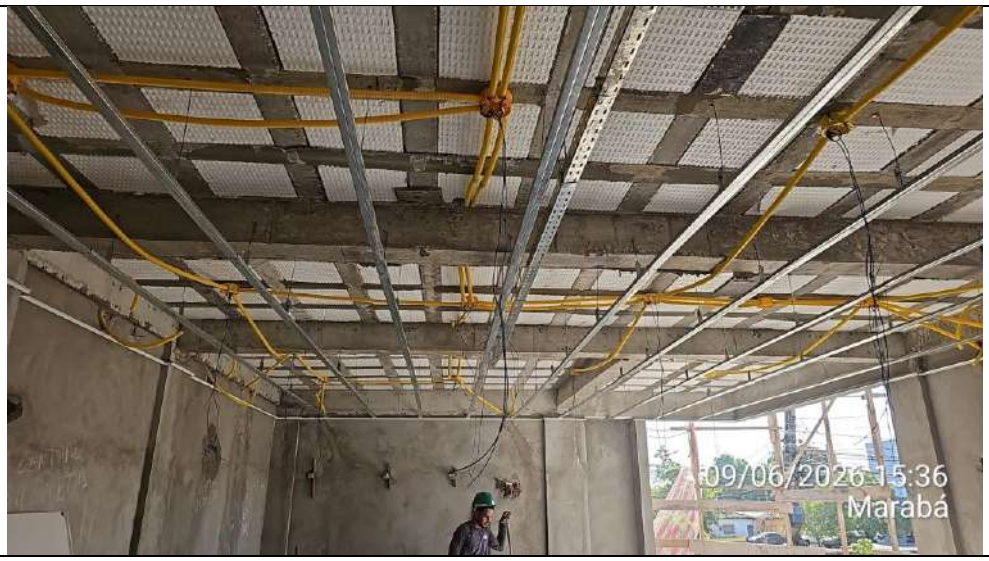	
Ocorrências:	

Data:	10/06/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Visão geral da obra do Anexo 02 (fachada frontal):  Anexo 01 – Instalações elétricas e de esgoto dentro na parede de gesso acartonado: 

	Anexo 01 – Continuação das intalações elétricas: 
Ocorrências:	

Data:	11/06/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Visão geral da obra do Anexo 02 (fachada frontal):  Anexo 01 – Instalações elétricas e aplicação de selador nas paredes:


11/06/2026 11:15
Marabá


11/06/2026 11:15
Marabá



11/06/2026 11:15
Marabá


	Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 3º pavimento (alguns trechos externos são em alvenaria com tijolo deitado para manter a conformidade com o prédio existente): 
Ocorrências:	

Data:	12/06/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Instalações elétricas, de água fria e de esgoto sobre o forro:  Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 3º pavimento (alguns trechos externos são em alvenaria com tijolo deitado para manter a conformidade com o prédio existente):



Anexo 02 – Contrapiso do corredor do 2º pavimento:

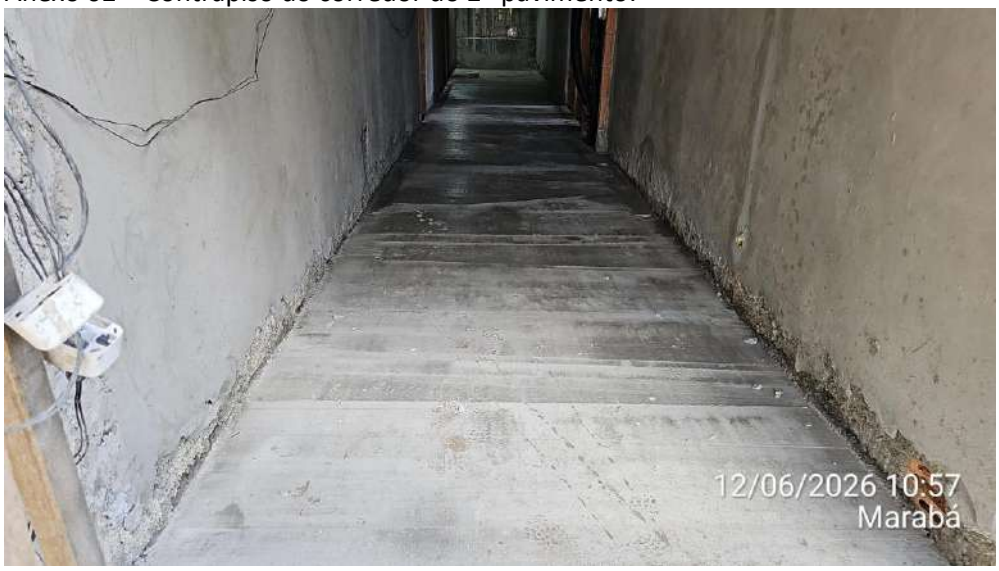

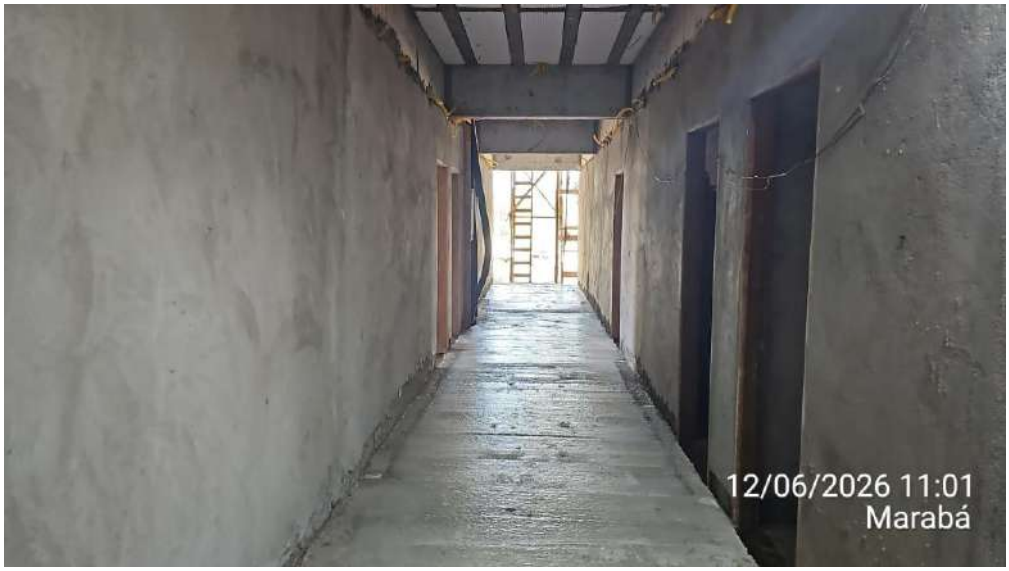

Anexo 02 – Continuação da alvenaria, vergas e chapisco do 3º pavimento:



Vergas:






Chapisco:







Anexo 02 – Vigas da lajede cobertura desformas:

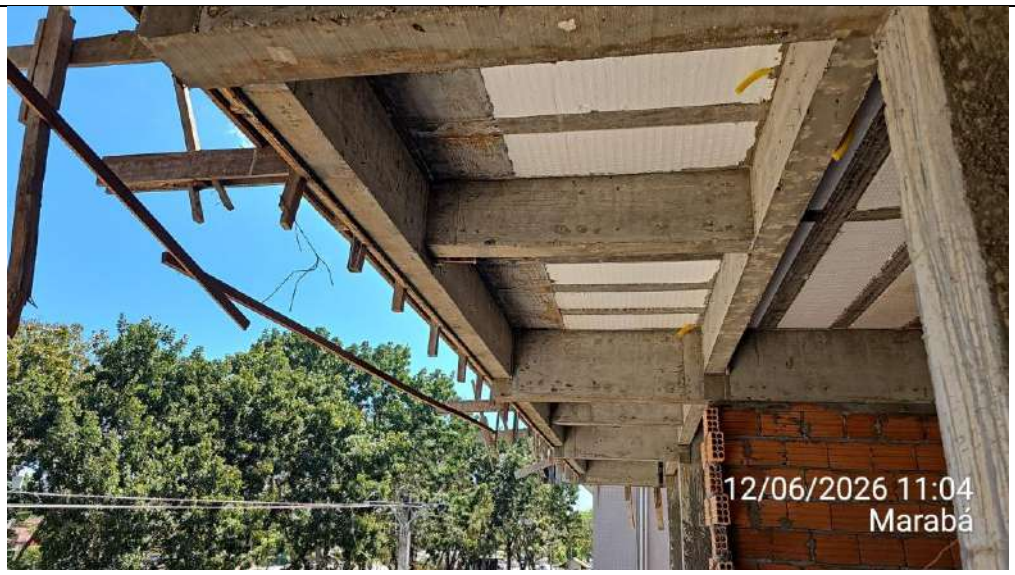



Anexo 02 – Alvenaria de trechos externos do Anexo 02, executados com tijolo deitado, para manter a mesma espessura das paredes da fachada do prédio existente:





Anexo 02 – Colocação armadura das percintas da platibanda/marquise do telhado:





Anexo 02 – Armadura e início da montagem das fôrmas das percintas da platibanda/marquise:

	 Anexo 02 – Início da montagem/soldagem da estrutura metálica para a cobertura/telhado in loco: 
Ocorrências:	


Data:	15/06/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Montagem de parte dos andaimes da fachada e continuação da alvenaria do 3º pavimento:





Anexo 01 – Instalações de água fria e esgoto dos banheiros do térreo, às quais serão embutidas dentro da parede drywall e início do fechamento dos banheiros do pavimento térreo com placas de gesso acartonado verde (resistente à umidade):

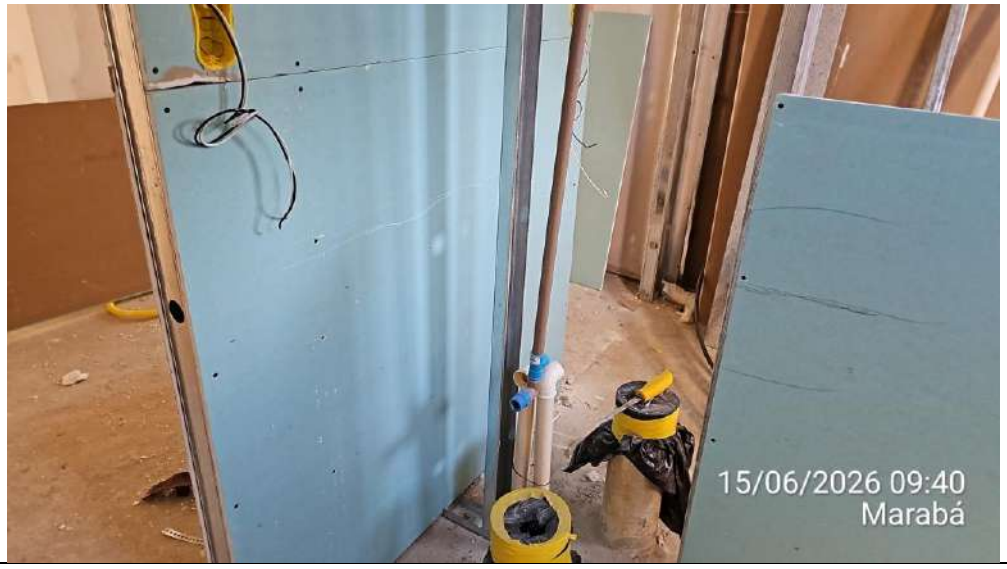

	
Ocorrências:	

Data:	16/06/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 3º pavimento (trechos externos em tijolo deitado):  Anexo 02 – Fachada lateral direita do prédio:

	 Anexo 02 – Nova guarita do estacionamento em andamento: 
Ocorrências:	

Data:	18/06/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Visão geral da obra com continuação da alvenaria do 3º pavimento:



Anexo 02 – Aplicação de selador nas paredes das salas do 2º pavimento:







18/06/2026 10:12
Marabá


18/06/2026 10:15
Marabá


18/06/2026 10:16
Marabá

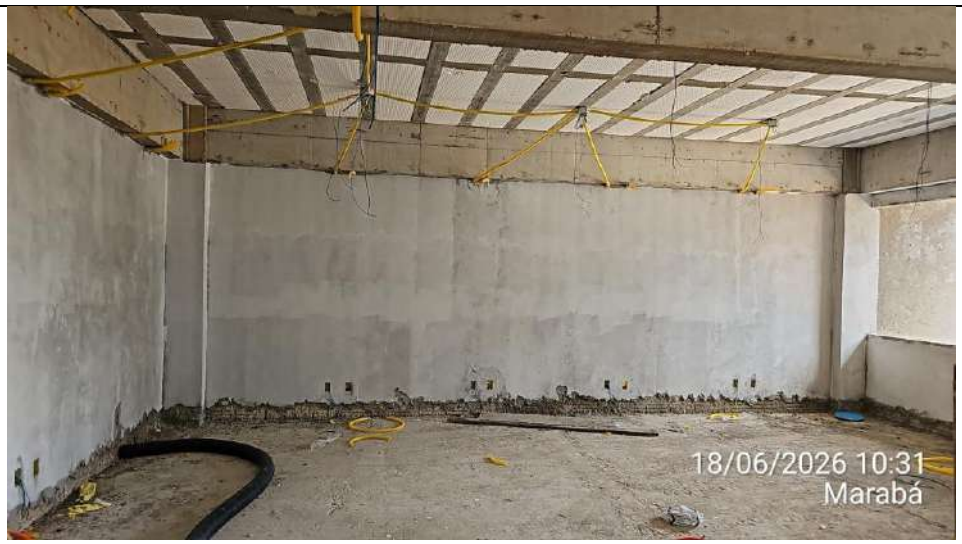



Anexo 02 – Instalação elétrica, passagem de eletrodutos e cabos no forro:





Anexo 02 – Continuação da alvenaria e chapisco do 3º pavimento:









Anexo 02 – vergas de portas e encunhamento em alvenaria:





Anexo 02 – Continuação da desfôrma:



Anexo 02 – Transporte de materiais:



Anexo 02 – Continuação chapisco, reboco e percintas concretadas e desformadas:





Anexo 02 – Armação e fôrmas de parte das percintas da platibanda:



Anexo 02 – Concretagem de percintas da platibanda:




Anexo 02 – Continuação da motagem da estrutura metálica para a cobertura/telhado:



Anexo 02 – Aplicação de selador em parte do forro e vigas aéras do estacionamento:




	
Ocorrências:	

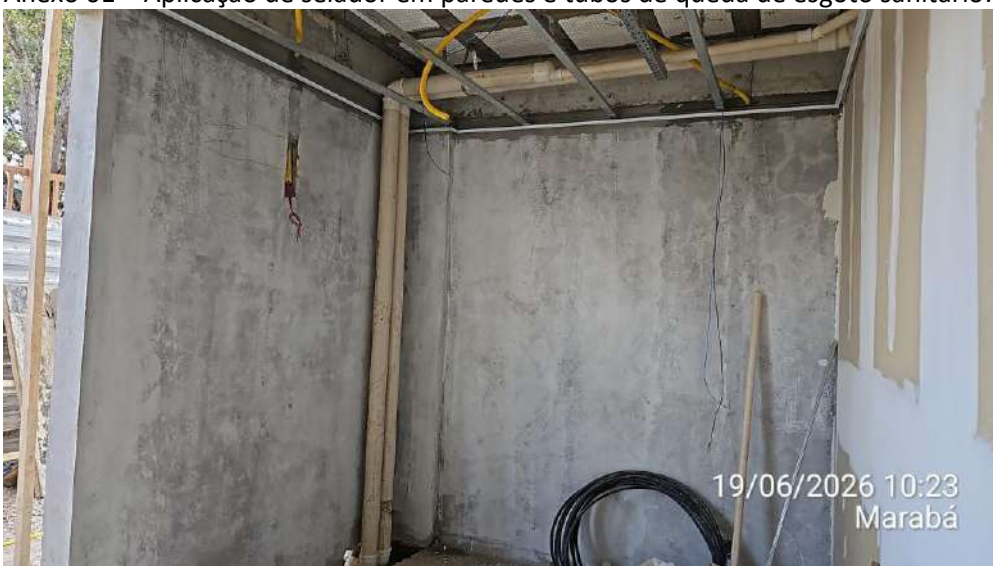Data:	19/06/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Aplicação de selador em paredes e tubos de queda de esgoto sanitário:  Anexo 01 – Paredes em drywall com chapa verde dos banheiros:


19/06/2026 10:23
Marabá


19/06/2026 10:24
Marabá

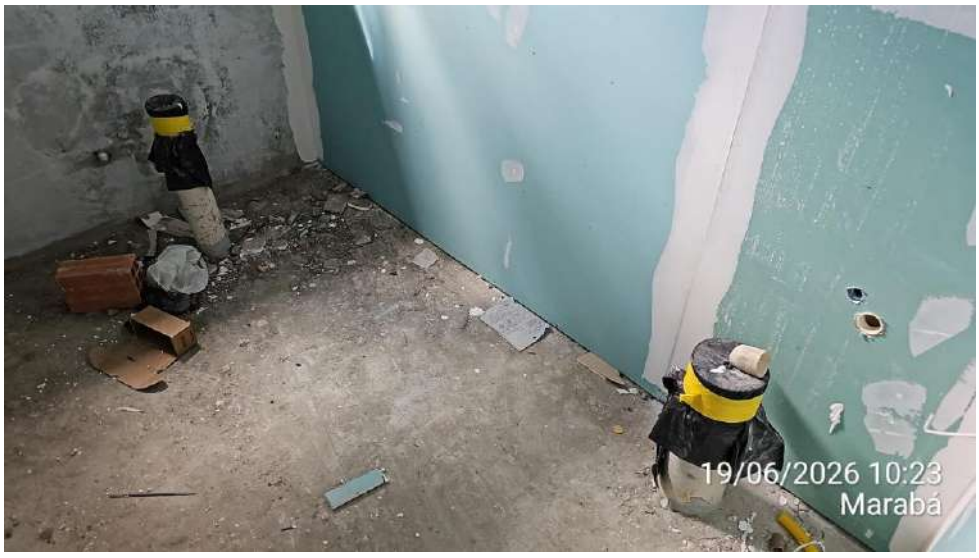
19/06/2026 10:23
Marabá







Anexo 01 – Instalação de água fria que alimenta os banheiros:



Anexo 02 – Emassamento de paredes – 1ª demão:





19/06/2026 10:26
Marabá


19/06/2026 10:27
Marabá


19/06/2026 10:30
Marabá




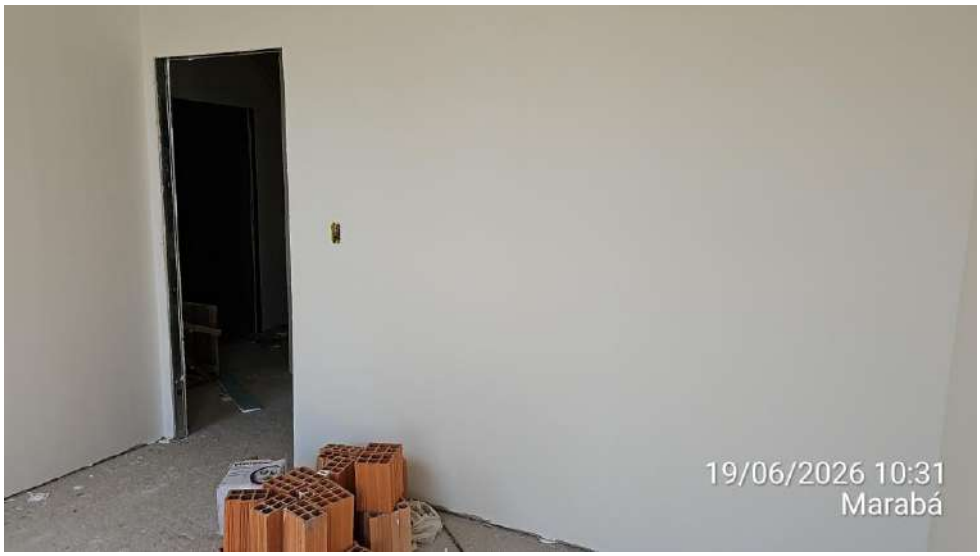




Anexo 01 – Passagem de cabos de rede e de eletricidade:



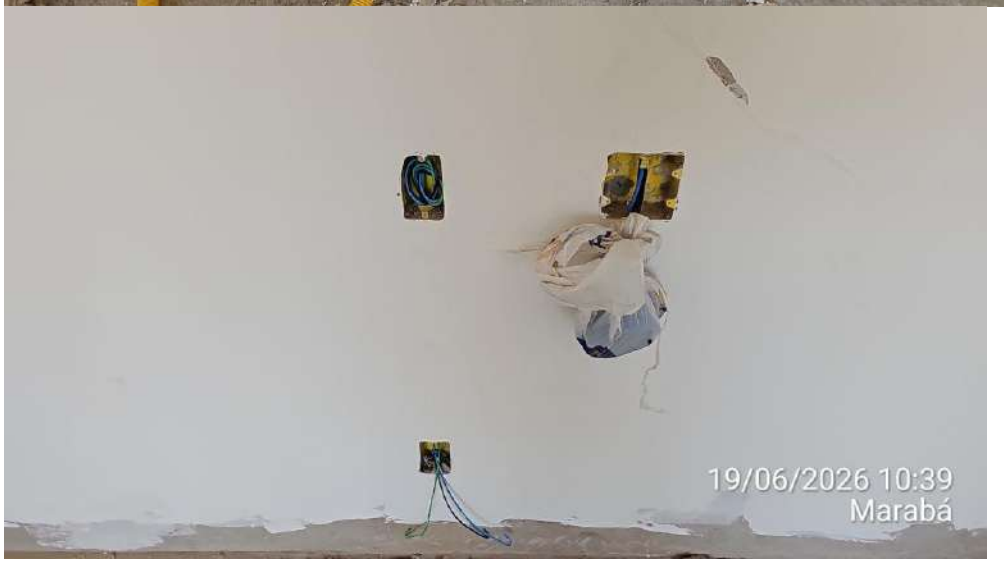

Anexo 01 – Assentamento de granito em vãos de esquadrias andar superior:

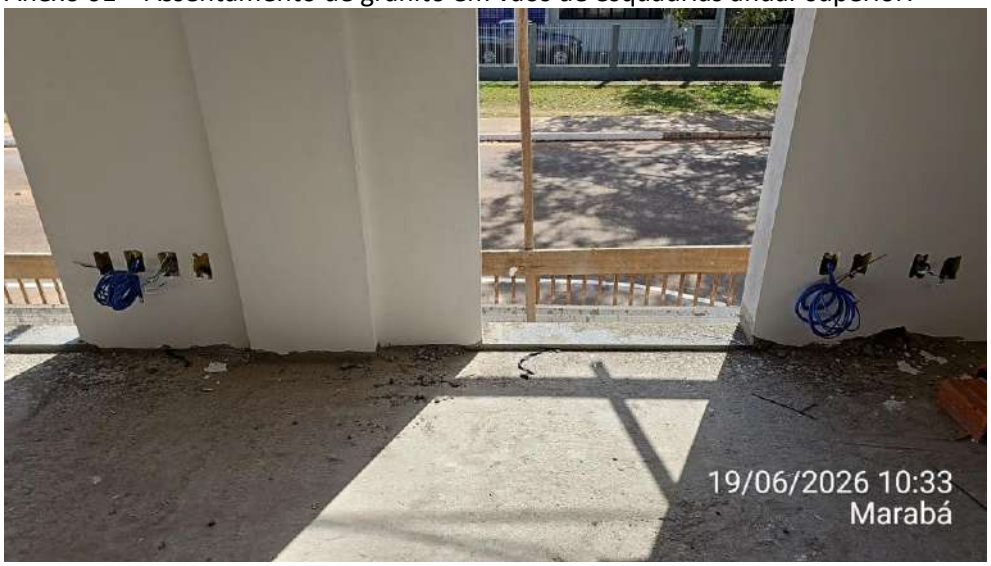



Anexo 01 – Abertura de vala, tubos e reaterro para ramal de esgoto:



Anexo 02 – Aplicação de selador em parte do forro e vigas aéreas do estacionamento:





Anexo 02 – Armação e fôrmas de parte das percintas da platibanda:



Anexo 02 – Desfôrma de percintas da platibanda:



Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 3º pavimento e confecção de vergas para portas:





	 Anexo 02 – Início dos rasgos em alvenaria para pasagem de eletrodutos: 
Ocorrências:	

Data:	22/06/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Visão geral da obra (fachada frontal):



Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 3º pavimento e confecção de vergas para portas:









Anexo 02 – Desfôrma de percintas da platibanda/marquise e continuação do chapisco e reboco.







Anexo 02 – Continuação da montagem da estrutura metálica do telhado/cobertura in loco:



Ocorrências:	

Data:	23/06/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Visão geral da obra:  

	
Ocorrências:	

Data:	24/06/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Aplicação de selador em parte do forro e vigas aéreas do estacionamento:  Anexo 02 – Passagem de eletrodutos e cabos no forro do 2º pavimento:



Anexo 02 – Montagem de andaimes na fachada lateral início do chapisco desta área:



:

Anexo 01 – Montagem da estrutura metálica para a cobertura/telhado in loco:







Anexo 01 – Caixa d’água 1000 litros:



	Anexo 01 – Início da pintura de proteção da estrutura metálica com esmalte sintético: 
Ocorrências:	

Data:	25/06/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da montagem da estrutura metálica para cobertura/telhado in loco:  Anexo 01 – Início da passagem da infraestrutura dos ar condicionado (pontos de gás com isolamento):







Anexo 02 – Confecção de contra-verga de janela, rasgo em alvenaria, e chapisco:


25/06/2026 10:35
Marabá


25/06/2026 10:35
Marabá


25/06/2026 10:35
Marabá

	 Anexo 02 – Contra-verga de janela desfôrmada: 
Ocorrências:	

Data:	26/06/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Corredor do 2º pavimento com selador aplicado nas paredes:



Anexo 02 – Emassamento de paredes – 1ª demão:







Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 2º pavimento:




Anexo 01 – Instalação de infraestrutura para ar condicionado (tubos de cobre, isolamento, cabo PP e caixa de passagem com dreno):



Saída da infra dos ar condicionados para o telhado:





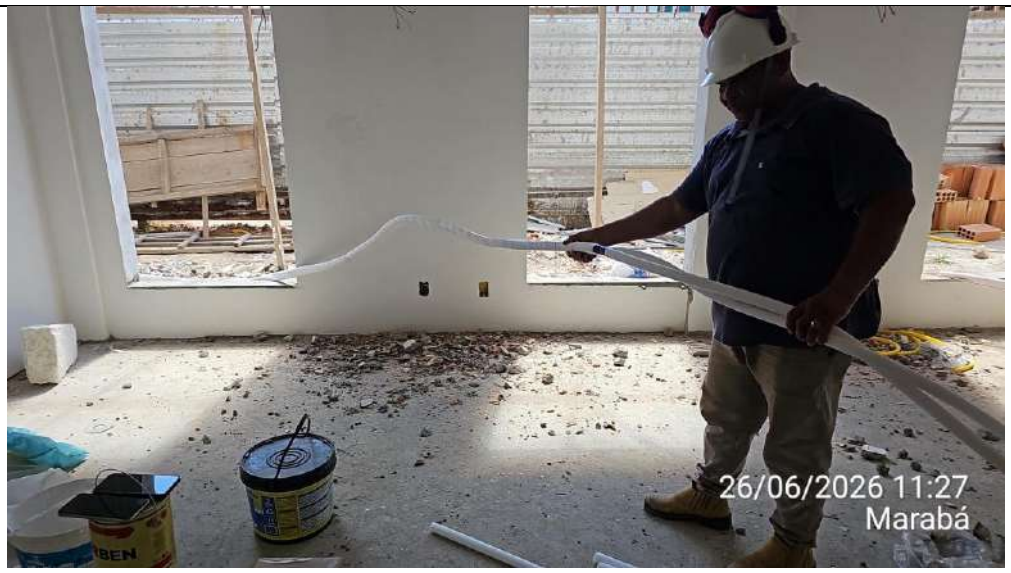


Anexo 01 – Continuação da pintura da estrutura metálico do telhado:



Anexo 01 – Continuação da instalação da caixa d'água com tubos e conexões (extravasor, flanges, suspiro e barrilete de distribuição):



	Anexo 02 – Continuação do chapisco de sala do 3º pavimento: 
Ocorrências:	

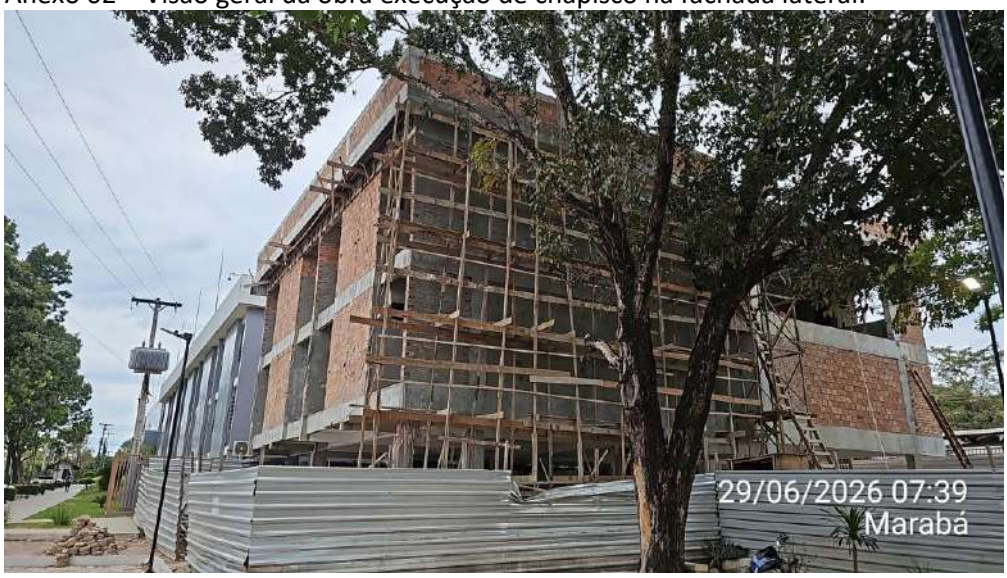Data:	29/06/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Visão geral da obra execução de chapisco na fachada lateral: 

Anexo 02 – Continuação do emassamento:





Anexo 02 – Execução de vergas para janelas e continuação do chapisco:




29/06/2026 09:10


29/06/2026 09:15
Marabá


29/06/2026 09:15
Marabá



Anexo 02 – Passagem e chumbamento de eletrodutos em paredes do 2º pavimento:






	 Anexo 02 – Reboco em paredes do 2º pavimento: 
Ocorrências:	

Data:	30/06/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Início do forro em drywall (gesso acartonado):



Anexo 01 – Infraestrutura para ar condicionados:

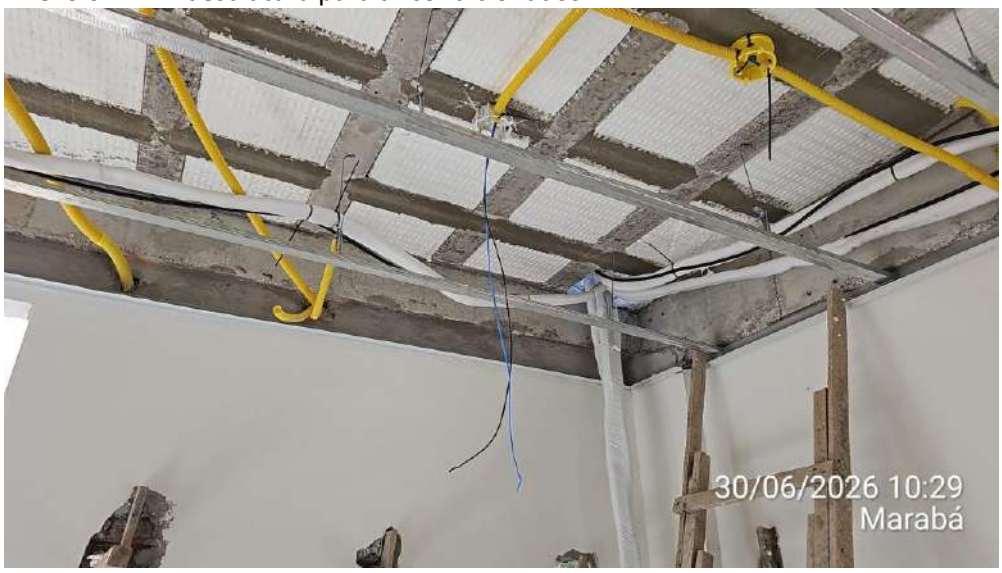



	
Ocorrências:	

Data:	02/07/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Rasgos em alvenaria para passagem de eletrodutos: 



Anexo 02 – Eletrodutos chumbados:




Anexo 02 – Continuação do reboco interno das salas do 3º pavimento:







Anexo 02 – Emassamento de paredes do 2º pavimento:

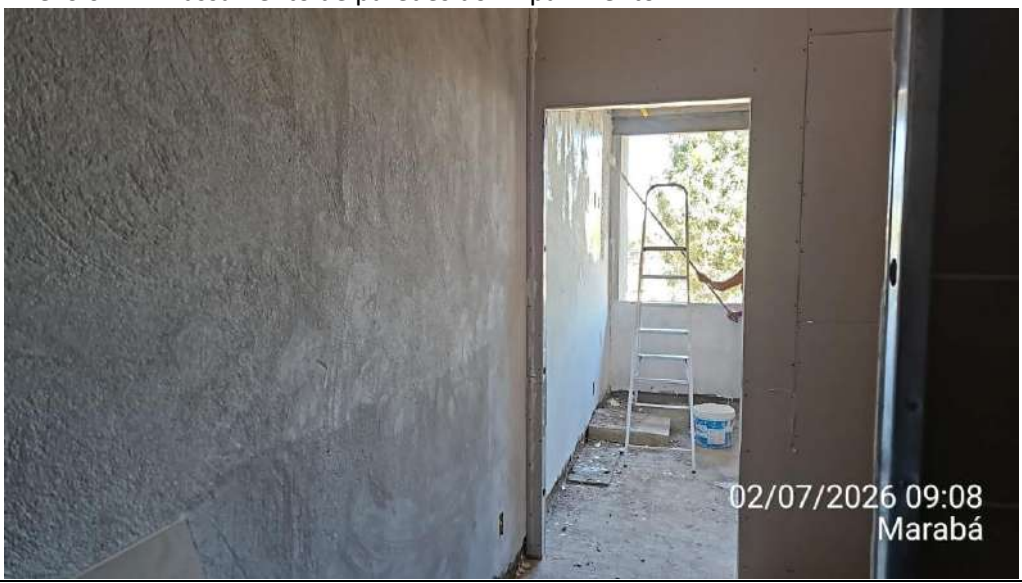

Anexo 02 – Pintura da estrutura metálica do telhado/cobertura:



Anexo 01 – Continuação do forro em drywall:










Anexo 01 – Chumbamento de quadro elétrico do térreo:

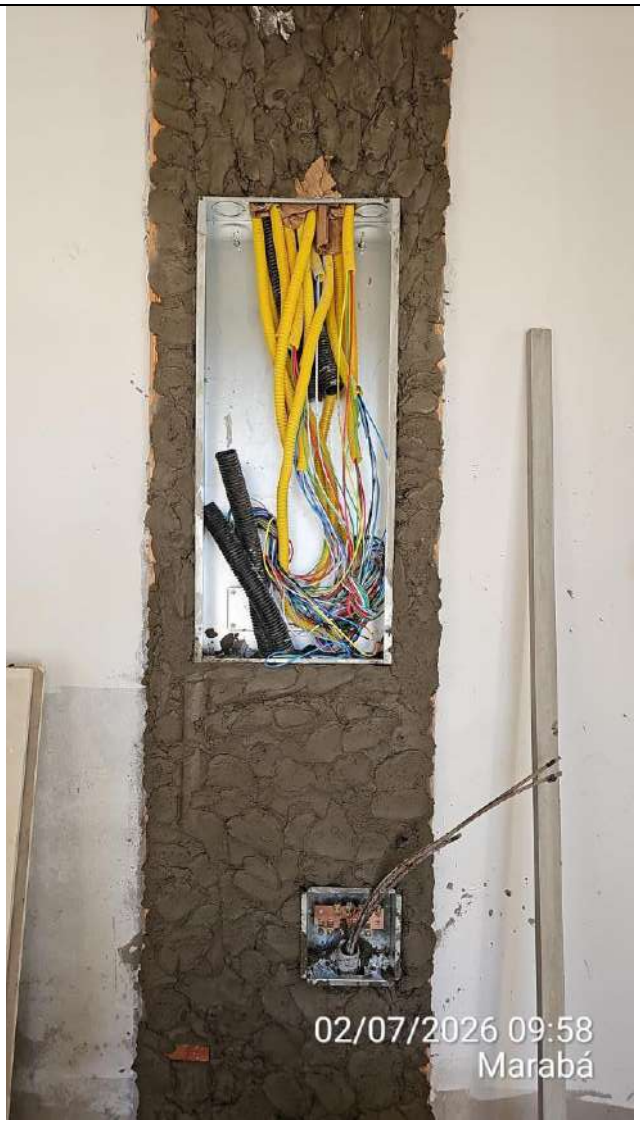

Anexo 01 – Chumbamento de quadro de equipotencialização do SPDA:



Anexo 01 – Finalização da pintura da estrutura métalico do telha do Anexo 01 que ira receber a cobertura em telhas termoacusticas e a calha de aço galvanizado:




Anexo 01 – Caixa d’água com tubos e conexões:




Anexo 01 – Barrilete de distribuição:






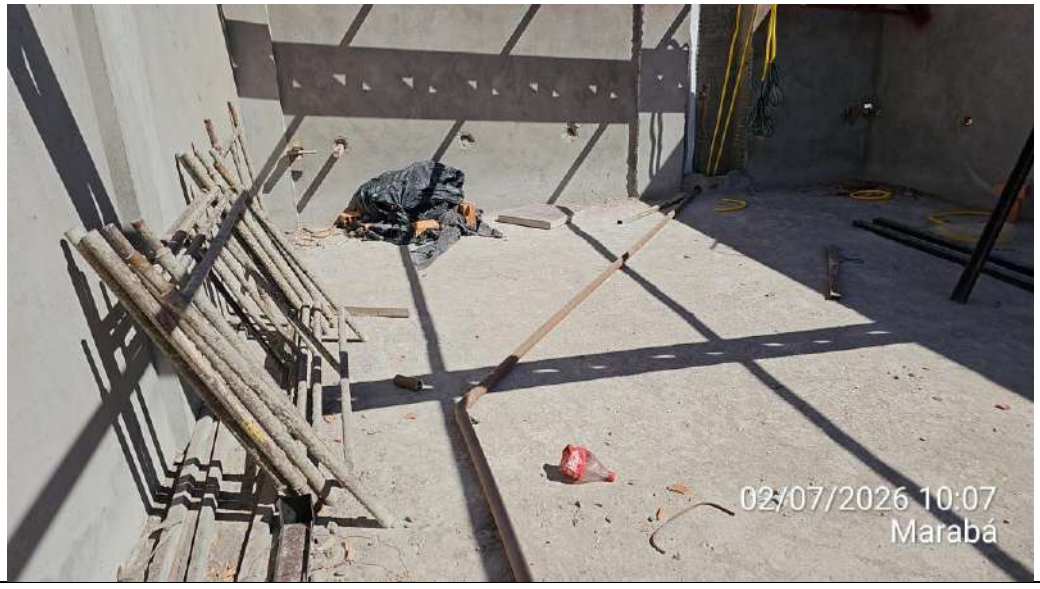

Ocorrências:	

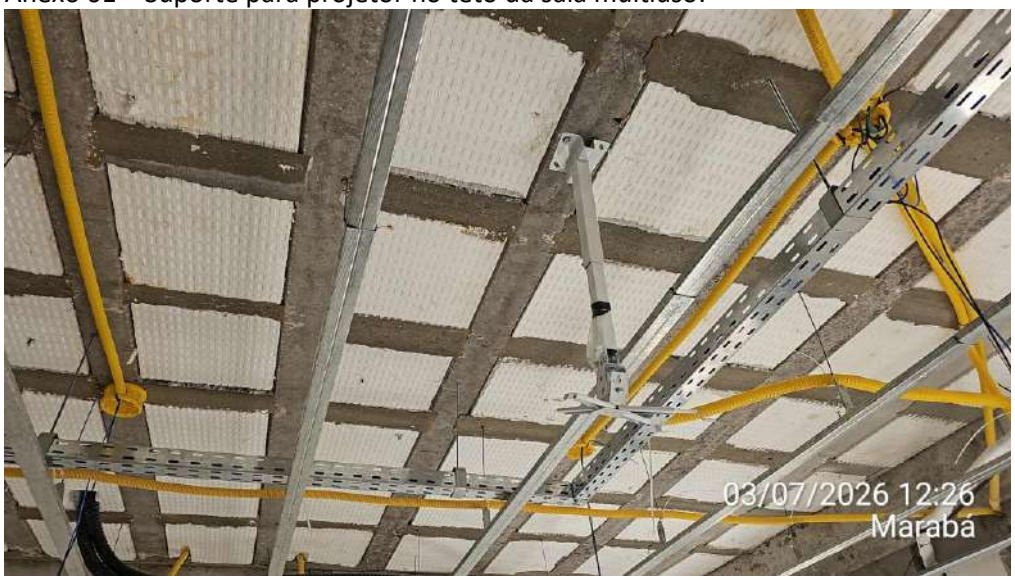Data:	03/07/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Início do reboco da fachada lateral:  Anexo 01 – Suporte para projetor no teto da sala multiuso:  Anexo 01 – Chumbamento de caixa de quadros elétricos com os eletrodutos:

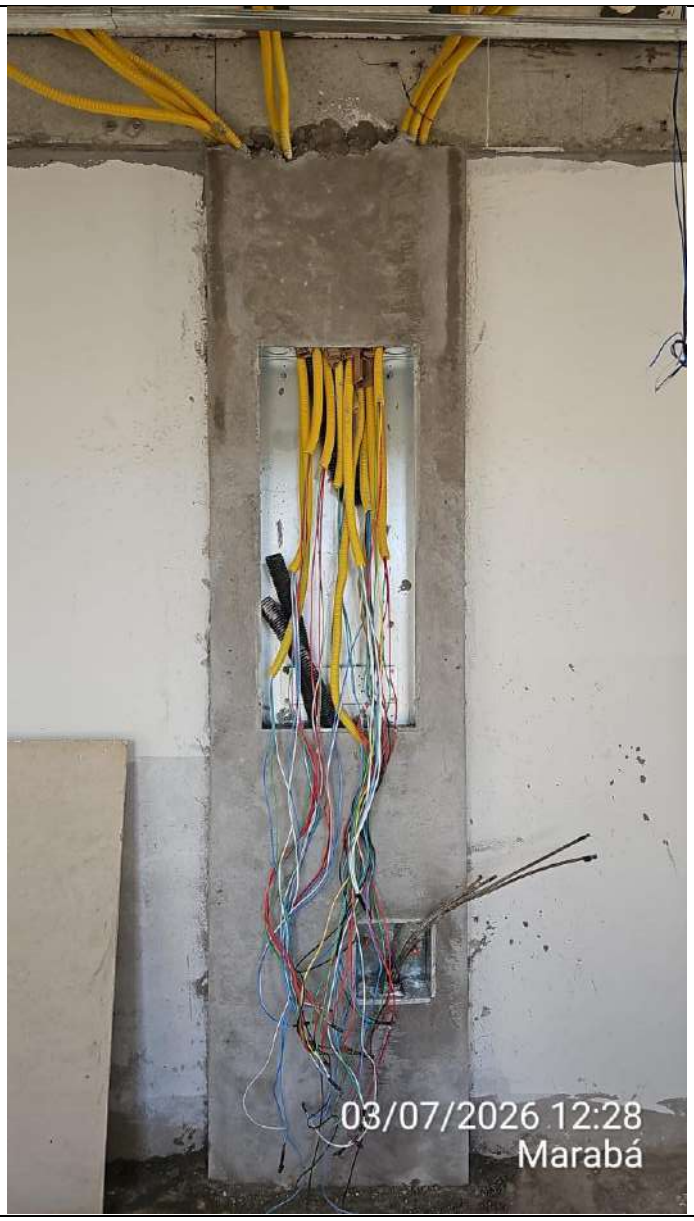	03/07/2026 12:28 Marabá	



Anexo 01 – Passagem de cabos de rede para as tomadas de piso do atendimento:




Anexo 01 – Continuação do forro de drywall:





Anexo 01 – Instalação de calha de aço galvanizado:

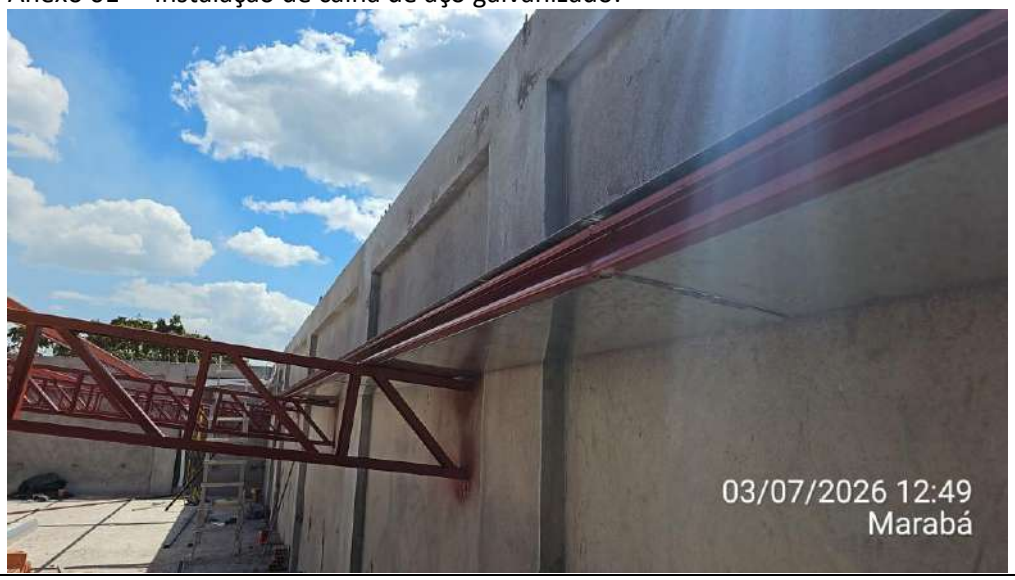



Anexo 01 – Passagem de de pontos elétricos para o telhado (para centrais de 25000 e 30000 Btus que exigem alimentação diretamente na unidade condensadora):



Anexo 01 – Peitoris de granito das janelas dos banheiros do térreo:



Ocorrências:	

Data:	06/07/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Instalação de eletrocalha no corredor do 2º pavimento:  Anexo 02 – Continuação do reboco e chumbamento de eletrodutos do 2º pavimento: 






Anexo 02 – Continuação do reboco da fahcada lateral:



Anexo 01 – Pintura da fachada externa atrás das esquadrias em pele de vidro na cor preta:



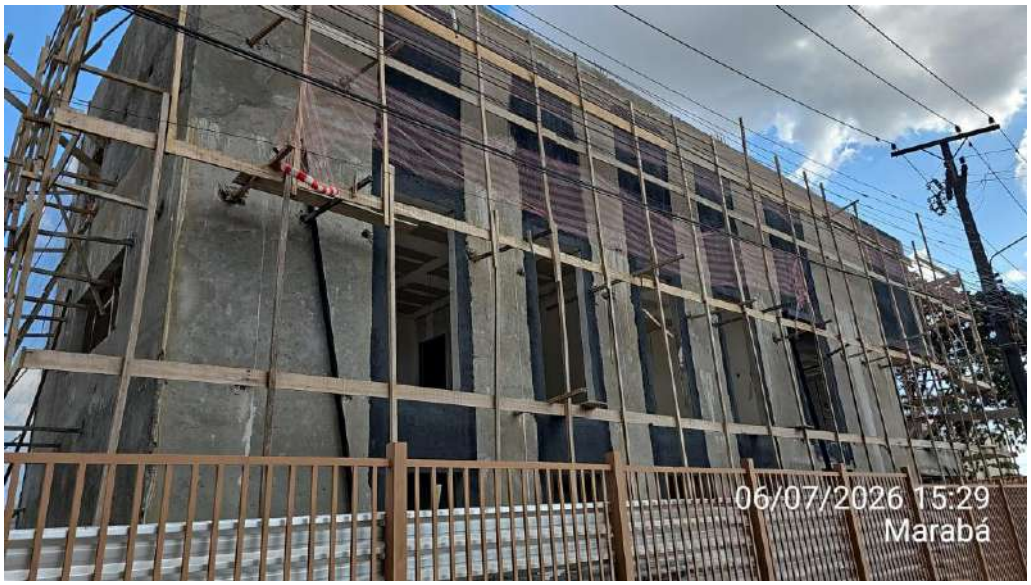


Anexo 01 – Continuação do forro em drywall (gesso acartonado):





Anexo 01 – Continuação das paredes em drywall (gesso acartonado):

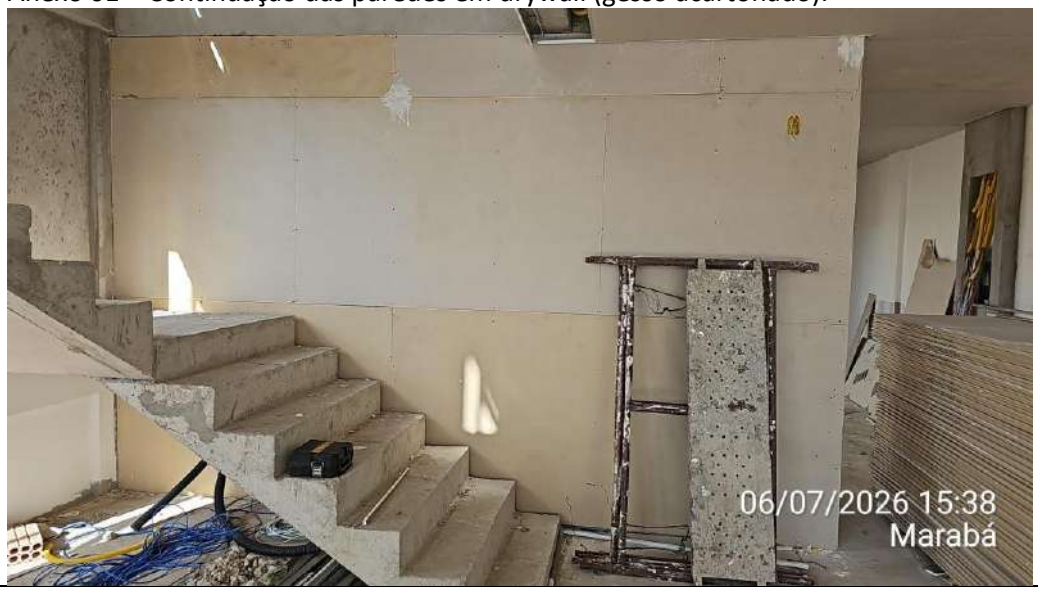

Ocorrências:	

Data:	07/07/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Passagem de cabos de rede do 2º pavimento:  



Anexo 02 – Continuação do emassamento do 2º pavimento:



Anexo 02 – Continuação do reboco do 3º pavimento:




Anexo 01 – Shaft com tubos de queda de esgoto e condutores verticais de água pluvial:





Anexo 02 – Ramal de ligação do banheiro do estacionamento:

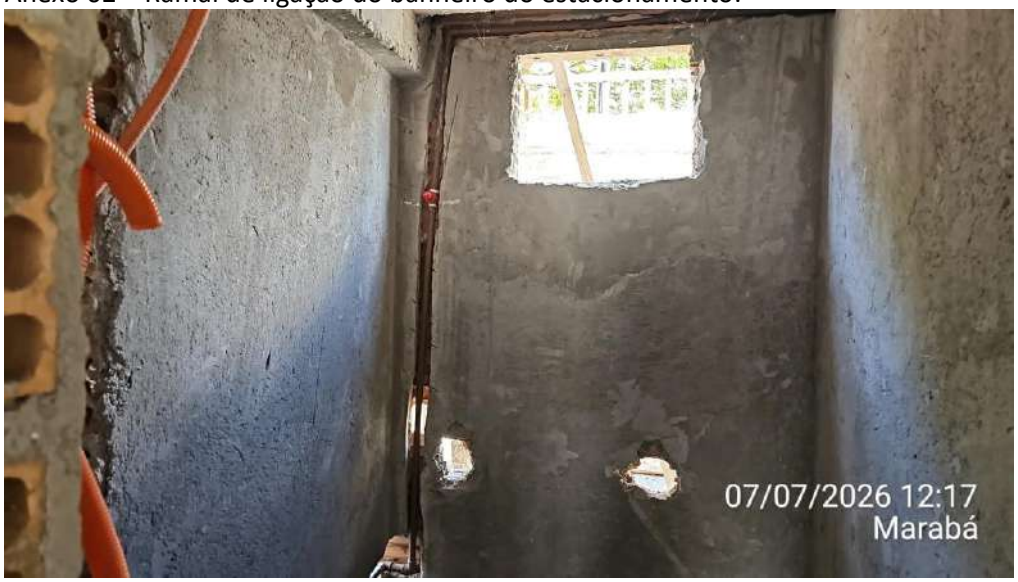

	
Ocorrências:	

Data:	08/07/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do reboco externo do 3º pavimento: 

<table>
<tr><td></td><td>


Anexo 01 – Continuação da pintura em preto da parte da fachada que ficará atrás das peles de vidro:


</td></tr>
<tr><td>Ocorrências:</td><td>Informo que houve visita dos técnicos da Vale para aferição in loco da medição do mês de junho.</td></tr>
</table>

Marabá/PA, 09 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
WALISON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 09/07/2026 15:27:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato
